ECOWAS COMMISSION
COMMISSION DE LA CEDEAO
COMISSÃO DA CEDEAO

AFD

Rapport annuel 2024et PTBA 2025

Programme Agroécologie en Afrique de l'Ouest - PAE

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX **3**

LISTE DES FIGURES **3**

ACRONYMES **4**

RESUME EXECUTIF **6**

RAPPORT AU 31/12/24 ..... **8**

1 | CONTEXTE DU PROJET ET PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS **8**

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 8
1.2 BREVE DESCRIPTION DU PROJET 8
1.2.1 Objectifs et composantes du programme *8*
1.2.2 Rappel des principaux résultats attendus et stratégies d'intervention du programme *9*
1.2.3 Zones d'intervention et coût du programme *10*
1.3 FAITS MARQUANTS DANS L'ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME 10

2 | ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CTS 2023 ..... **11**

3 | EXECUTION PHYSIQUE DU PROJET EN 2024 ..... **12**

3.1 COMPOSANTE ATA - APPUI A LA TRANSITION AGROECOLOGIQUE POUR LES ACTEURS LOCAUX 12
3.1.1 ATA.3 - Suivi-évaluation, capitalisation interne et audits des projets de terrain *12*
3.2 COMPOSANTE FRC - FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR L'INTENSIFICATION AGROECOLOGIQUE ET L'AGRICULTURE DURABLE 14
3.2.1 FRC.2 – Appui au développement des activités des centres de formation *14*
3.2.2 FRC.3 – Appui à l'enseignement supérieur *19*
3.3 COMPOSANTE ACV - APPUI-CONSEIL ET VULGARISATION DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 20
3.3.1 ACV.1 - Soutien à la mise en place des partenariats entre OPA, centres de recherche et centre de formation *20*
3.3.2 ACV.2 - Renforcement des capacités et appui méthodologiques aux dispositifs de vulgarisation *24*
3.4 COMPOSANTE ECP - ECHANGES, CAPITALISATION ET CONTRIBUTION A L'ELABORATION DE POLITIQUES PUBLIQUES D'INTENSIFICATION AGROECOLOGIQUE 25
3.4.1 ECP.1 - Mise en place d'un réseau régional et de dispositifs d'échanges *25*
3.4.2 ECP.2 - Appui au processus de capitalisation des résultats obtenus et diffusion des « bonnes pratiques » *26*
3.4.3 ECP.3 - Mise en place et animation des cadres de concertation nationaux et plaidoyer *28*
3.4.4 ECP.4 - Appui à la mise en place du PRIASAN et des PNIASAN et financement de l'agroécologie *29*
3.5 COMPOSANTE CG - COORDINATION ET GESTION DU PROGRAMME 30
3.5.1 CG.1 - Appui à la maitrise d'ouvrage dans la coordination et la gestion courante du PAE *30*
3.5.2 CG.2 - Suivi-Evaluation *31*
3.5.3 CG.3 - Audits et appuis à l'ARAA *31*
3.6 SYNTHESE DES REALISATIONS PHYSIQUES 32

4 | EXECUTION BUDGETAIRE DU PROJET EN 2024 ..... **33**

4.1 EXECUTION FINANCIERE DU PTBA 2024 33

4.1.1 Etats des décaissements faits par l'AFD 33
4.1.2 Engagements contractuels additionnels de 2024 33
4.1.3 Dépenses justifiées de 2024 33
4.2 EXECUTION FINANCIERE GLOBALE 35
4.2.1 Etats des décaissements faits par l'AFD 35
4.2.2 Engagements contractuels globaux 35
4.2.3 Dépenses justifiées globales 36
4.3 EXECUTION FINANCIERE DU PATAE 36
4.3.1 Etats des décaissements faits par l'AFD 36
4.3.2 Engagements contractuels sur le PATAE 37
4.3.3 Dépenses justifiées globales 37
4.4 EXECUTION FINANCIERE DU PAIAD 37
4.4.1 Etats des décaissements faits par l'AFD 37
4.4.2 Engagements contractuels sur le PAIAD 38
4.4.3 Dépenses justifiées globales 38
4.4.4 Suivi de l'utilisation des tranches de préfinancement versées par l'UE à l'AFD 38

5 | PRINCIPALES DIFFICULTES, DEFIS ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 39

PTBA 2025 40

1 | ORIENTATIONS MAJEURES DU PTBA 2025 40

2 | PLAN DE TRAVAIL 2025 40

2.1 RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS 40
2.2 COMPOSANTE ATA - APPUI A LA TRANSITION AGROECOLOGIQUE POUR LES ACTEURS LOCAUX 40
2.3 COMPOSANTE FRC - FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR L'INTENSIFICATION AGROECOLOGIQUE ET L'AGRICULTURE DURABLE 41
2.4 COMPOSANTE ACV - APPUI-CONSEIL ET VULGARISATION DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 41
2.5 COMPOSANTE ECP - ECHANGES, CAPITALISATION ET CONTRIBUTION A L'ELABORATION DE POLITIQUES PUBLIQUES D'INTENSIFICATION AGROECOLOGIQUE 41
2.6 COMPOSANTE CG - COORDINATION ET GESTION DU PROGRAMME 41
2.6.1 CG.1 - Appui à la maitrise d'ouvrage dans la coordination et la gestion courante du PAE 41
2.6.2 CG.2 - Suivi-Evaluation 42
2.6.3 CG.3 - Audits et appuis à l'ARAA 42

3 | BUDGET 2025 DU PAE 43

4 | CONCLUSION, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 44

ANNEXES 45

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 : ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CTS DE DECEMBRE 2023 11
TABLEAU 2 : ÉTAT DES VERSEMENTS AUX CENTRES DE FORMATION 115
TABLEAU 3 : ÉTAT DES VERSEMENTS AUX PARTENARIATS 21
TABLEAU 4 : TAUX DE DECAISSEMENT PAR L'AFD DU BUDGET DU PTBA 33
TABLEAU 5 : TAUX DE DEPENSES JUSTIFIEES PAR ACTIVITE DU PTBA 2024 34
TABLEAU 6 : TAUX DE DECAISSEMENT GLOBAL PAR L'AFD DU BUDGET DU PAE 35
TABLEAU 7 : TAUX DE DEPENSES JUSTIFIEES GLOBALES DU PAE PAR COMPOSANTE 36
TABLEAU 8 : TAUX DE DECAISSEMENT GLOBAL PAR L'AFD DU BUDGET DU PATAE 37
TABLEAU 9 : TAUX DE DEPENSES JUSTIFIEES DU PATAE PAR COMPOSANTE 37
TABLEAU 10 : TAUX DE DECAISSEMENT GLOBAL PAR L'AFD DU BUDGET DU PAIAD 37
TABLEAU 11 : TAUX DE DEPENSES JUSTIFIEES DU PAIAD PAR COMPOSANTE 38
TABLEAU 12 : DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS APPORTEES 39
TABLEAU 13 : PREVISIONS BUDGETAIRES DE 2025 43

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 : EXTRAITS DE LA MAQUETTE DU GUIDE DE CAPITALISATION DES PROJETS DE TERRAIN 13
FIGURE 2 : BASSINS POUR LE SYSTEME INTEGRE RIZ-POISSON AU CENTRE DE FORMATION TAVTC AU LIBERIA 20
FIGURE 3 : RECOLTE DU MANIOC DANS UN CHAMP ECOLE PAYSAN DU PARTENARIAT DE COTE D'IVOIRE 24
FIGURE 4 : PHOTO DE FAMILLE DU FORUM SUR L'AGROECOLOGIE ET L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE A ABUJA 26
FIGURE 5 : APERÇU GENERAL DU PROGRAMME PROVISOIRE DE TRAVAIL DE LA CAPITALISATION TRANSVERSALE 27
FIGURE 6 : PAGES DE COUVERTURES DES NEWSLETTERS DE L'AGROECOLOGIE 28
FIGURE 7 : PHOTO D'UNE SESSION DE LA FORMATION SUR LA FINANCE CLIMAT 29
FIGURE 8 : TAUX D'EXECUTION DES ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2024 PAR COMPOSANTE 293
FIGURE 9 : EVOLUTION DES DECAISSEMENTS PAR L'AFD DES FONDS DU PAE DE 2018 A 2024 35
FIGURE 10 : EVOLUTION DU MONTANT DE DEPENSES JUSTIFIEES DU PAE DE 2018 A 2024 36

ACRONYMES

3AO	Alliance pour l'Agroécologie en Afrique de l'Ouest
ACF	Action Contre la Faim (*Burkina Faso*)
AFD	Agence Française de Développement
AFDI	Agriculteurs Français et Développement International (*Côte d'Ivoire*)
AMEDD	Association Malienne d'Éveil au Développement Durable (*Mali*)
ANOPACI	Association Nationale des Organisations Professionnelles Agricoles de Côte d'Ivoire
ARAA	Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation
ASPRODEB	Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement par la Base (*Sénégal*)
AVSF	Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
BIDC	Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO
BOAD	Banque Ouest Africaine de Développement
CCN	Cadre de Concertation National
CED	Centre pour l'Ecologie et le Développement (*Togo*)
CEDEAO	Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CF	Centre de Formation en Agroécologie
CN	Correspondant(s) National(aux)
CR	Centre de Recherche
CoPil	Comité de Pilotage
CPS	Contrat de Prestations de Services
CTS	Comité Technique de Suivi
ECLOSIO	ONG de l'Université de Liège (*Sénégal*)
EFTP	Etablissements de Formation Technique et Professionnelle
ESA	Ecoles Supérieures d'Agriculture
ETD	Entreprises Territoires et Développement (*Togo*)
FED	Fonds Européen pour le Développement
FPGL	Fondation Paul Gérin-Lajoie (*Mali*)
GRFAS	Global Forum for Rural Advisory Services
IECD	Institut Européen de Coopération et de Développement (*Côte d'Ivoire*)

INADES	Institut Africain pour le Développement Economique et Social
IRAM	Institut de Recherches et d'Application des Méthodes de développement
MAEE	Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
MO	Maîtrise d'Ouvrage
MOOC	Massive Open Online Course
MoU	*Memorandum of Understanding* / Mémorandum d'Entente et de Coopération
OP	Organisation de Producteurs
OPA	Organisation Professionnelle Agricole
PAE	Programme AgroEcologie en Afrique de l'ouest
PAIAD	Projet d'Appui à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'Intensification Agricole Durable
PATAE	Projet d'Appui à la Transition Agroécologique en Afrique de l'Ouest
PD	Propositions Détaillées
PIR	Programme Indicatif Régional
PNIA	Programme National d'Investissement Agricole
PNIASIAN	Programme National d'Investissement Agricole
PPM	Plan de Passation des Marchés
PRIA	Programme Régional d'Investissement Agricole
PRIASAN	Programme Régional d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel
PTF	Partenaire Technique et Financier
RAFIA	Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d'Auto-développement (*Togo*)
RESCAR-AOC	Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural d'Afrique de l'Ouest et du Centre
ROPPA	Réseaux des Organisations Paysannes et des Producteurs de l'Afrique de l'Ouest
TdR	Termes de Référence
THP	*The Hunger Project* (*Sénégal*)
TV	Terre Verte (*Burkina Faso*)
UAVES	Union pour un Avenir Écologique et Solidaire (*Mali*)
UCP	Unité de Coordination du Projet
UE	Union Européenne
UPPA-HOUET	Union Provinciale des Professionnels Agricoles des hauts-bassins du Houet (*Burkina Faso*)

RESUME EXECUTIF

Le Programme Agroécologie (PAE) est une initiative conjointe mise en place par la CEDEAO, l'Union Européenne (EU) et l'Agence Française de Développement (AFD) pour améliorer les performances des exploitations agricoles familiales et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations face au changement climatique. Le PAE est mis en œuvre à travers cinq (5) composantes à savoir : (i) Appui à la transition agroécologique pour les acteurs locaux - ATA, (ii) Formation et renforcement des capacités pour l'intensification agroécologique et l'agriculture durable - FRC, (iii) Appui-conseil et vulgarisation des innovations technologiques pour l'intensification agricole durable adaptées aux modes de production des petits producteurs agricoles - ACV, (iv) Echanges, capitalisation et contribution à l'élaboration de politiques publiques d'intensification agroécologique - ECP et (v) Coordination et gestion du Programme - CG.

Le présent rapport annuel d'activités 2024 du PAE couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et présente Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2025.

Sur chacune de ces composantes, les principales réalisations en 2024 se présentent comme suit :

Sur la composante ATA, les activités réalisées ont concerné la clôture des derniers projets de terrain, la finalisation de l'évaluation finale et capitalisation des projets terrains et la conduite des audits finaux.

Concernant la composante FRC, les principales réalisations ont porté sur la formation des apprenants par les centres de formation agricoles ayant reçu les subventions de la CEDEAO pour améliorer leurs offres de formation en agroécologie, renforcer leurs infrastructures et équipements pédagogiques et la signature de l'accord de subvention entre la CEDEAO et le l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal qui assure le lead du Consortium d'Universités chargé d'animer le MOOC Agroécologie d'Afrique de l'Ouest, ainsi que la tenue de l'atelier de formation de l'unité de coordination du MOOC à l'Institut Sup Agro en France. Les missions de suivi-évaluation de ces centres de formation ont été effectuées et ont permis d'apprécier les niveaux d'exécution des activités et des dépenses ainsi que de faire des recommandations adéquates pour l'atteinte des résultats escomptés.

Pour ce qui est de la composante ACV, les activités exécutées ont concerné le démarrage des études sur le conseil agricole au Nigéria, Ghana et Guinée-Bissau par le CIRAD, 'appui à la mise en place des projets de partenariats entre les organisations professionnelles agricoles (OPA), les centres de recherche et les centres de formation, les missions de suivi-évaluation des projets de partenariat ont été effectuées et ont permis d'apprécier les niveaux d'exécution des activités et de faire des recommandations adéquates pour l'atteinte des résultats escomptés. Cette composante a été marquée également par le renforcement des capacités et appui méthodologique aux dispositifs de vulgarisation par les Correspondants Nationaux (CN) du PAE.

Quant à la composante ECP, les activités réalisées ont porté sur l'organisation conjointe d'une édition spéciale de forum sur l'agroécologie et l'agriculture biologique par l'Alliance pour l'Agroécologie en Afrique de l'Ouest – 3AO, WAfrOnet, l'ONG Action Aid et la CEDEAO. Ce forum a été aussi marqué par le lancement de la plateforme Numérique de partage d'informations de 3AO, l'appui au processus de capitalisation transversale, la mise en place et l'animation des cadres de concertation nationaux par les CN, la poursuite des activités de communication et la formation des cadres nationaux et régionaux sur l'accès au fonds climat et sur l'élaboration des projets agricoles sensibles au climat.

Enfin, au titre de la composante CG, l'année 2024 a été marquée par la préparation des avenants de prolongation du contrat opérateur jusqu'en août 2024 afin d'assurer une clôture sereine du programme, l'implication de l'UCP dans plusieurs réunions régionales et l'appui à l'instruction et d'un nouveau programme DeSIRA+AO et la signature des conventions de financement.

Le budget prévisionnel des activités à exécuter en 2024 était de 6 073 628,75 €, dont 1 217 826,56 € imputables au financement de l'Agence Française de Développement (AFD) et 4 855 802,75 € imputable au financement de l'Union Européenne. Au 31/12/2024, 2 902 562,83 € ont été décaissés par les acteurs de mise en œuvre sur le PTBA 2024, dont 425 924,59 € sur le financement de l'AFD (35% d'exécution) et 2 476 638,23 € sur le financement européen (51% d'exécution) ; soit un taux global d'exécution du PTBA 2024 de 48 % au 31/12/2024.

Le taux d'exécution physique des activités programmées en 2024 est de 78% contre un taux d'exécution financière de 52%. La mise en œuvre des activités de 2024 a permis d'atteindre un taux d'exécution financière global de 86%, un taux d'engagement contractuel global de 75% et un taux de décaissement global de 93%. L'ensemble de ces taux vont évoluer rapidement au 14/08/2025 après la prise en compte des données finales des 42 autres centres de coûts que sont les 15 Correspondants Nationaux, les 13 centres de formations, les 13 partenariats OPA et 3AO.

Les principaux résultats attendus sont les suivants :

- L'ensemble des projets des centres de formation et des partenariats OPA-centres de recherche et centres de formation et ou structures de vulgarisation, les comptes des CN et de 3AO sont clôturés sur le plan comptable et les éventuels reliquats de fonds sont reversés à l'ARAA.
- Le guide de capitalisation est traduit dans les 3 langues et diffusé.
- La capitalisation transversale du Programme est bouclée.
- Un bilan global du Programme est réalisé et les résultats de la capitalisation sont partagés avec un grand public.
- Le contenu du MOOC Agroécologie est adapté au contexte ouest africain.
- Le rapport d'exécution final du Programme est élaboré et approuvé.
- Les excédents et les ressources non utilisées sont comptabilisés
- Le document de clôture technique et financière ainsi que les autres données relatives aux résultats du Programme sont introduits dans le système d'archivage informatisé de l'ARAA.
- Une note de clôture adossée au document de clôture est élaborée et approuvée par le DE de l'ARAA qui se charge de leur transmission aux bailleurs (AFD et UE).
- Les formulaires des notes de clôture technique et comptable sont remplis.
- Les documents de capitalisation sont publiés sur le site web de l'ARAA, de la DADR, de l'AFD et de l'UE et sur divers autres sites (UEMOA, CILSS, 3AO, etc.).

RAPPORT AU 31/12/24

1 | Contexte du projet et principaux faits marquants

1.1 Contexte et justification du projet

L'Afrique de l'Ouest comme la plupart des régions du continent est continuellement confrontée à une insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique où les populations vivent dans une situation d'extrême pauvreté aggravée par les effets néfastes du changement climatique. Cette situation amène la CEDEAO à revisiter périodiquement sa politique agricole régionale – ECOWAP pour tenir compte des défis présents et futurs. Ainsi, à la suite de la création de son cadre d'intervention pour le développement d'une agriculture climato-intelligente et son inscription dans la Politique agricole régionale (ECOWAP/PDDAA), la Commission de la CEDEAO a déployé plusieurs initiatives en collaboration avec divers partenaires techniques et financiers pour une transformation durable de son secteur agricole et plus globalement du système alimentaire régional.

C'est dans ce contexte que le Programme Agroécologie (PAE) a été mis en place pour accompagner les exploitations familiales vers une transition agroécologique leur permettant de concilier performances économiques (augmentation de la productivité et de la production, réduction des pertes, amélioration des revenus, etc.), sécurité alimentaire, renforcement de la résilience, préservation de l'environnement et santé des populations.

Conçu comme une alternative pour faire face aux défis de la vulnérabilité et des changements climatiques, les défis majeurs du PAE pour l'ECOWAP sont de : (i) moderniser les exploitations familiales en créant des emplois décents et en améliorant les revenus ; (ii) d'augmenter et de diversifier la production avec des systèmes durables et sains pour l'environnement et la santé des consommateurs ; (iii) de s'adapter aux changements et à la variabilité climatiques pour améliorer la biodiversité et la fertilité des sols et (iv) d'assurer la diversité, la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région.

1.2 Brève description du projet

1.2.1 Objectifs et composantes du programme

L'objectif général du PAE est d'améliorer les performances des exploitations agricoles familiales par l'augmentation des revenus et de la résilience aux changements climatiques favorisée par des processus de préservation et de restauration de l'état des écosystèmes cultivés et naturels ; ce qui permet de renforcer la résilience des populations de l'Afrique de l'Ouest en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Spécifiquement, il s'agit (i) d'accompagner la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest ; (ii) de favoriser l'émergence, l'adoption et la diffusion de pratiques agricoles écologiquement intensives dans les exploitations familiales, et (iii) de promouvoir des modes de gestion et d'organisation y compris de formation favorisant cette adoption.

Pour atteindre ces objectifs, le programme est articulé autour de cinq (5) composantes :

- **La composante Appui à la Transition agroécologique pour les acteurs locaux (ATA)** est centrée sur la promotion des initiatives de recherche-action pour l'intensification agricole

durable et la transition agroécologique. Pour la mise en œuvre de cette composante, des initiatives locales sont appuyées par la CEDEAO pour accompagner des collectifs d'agriculteurs et des communautés rurales vers une intensification agroécologique.

- **La composante Formation et renforcement des capacités pour l'intensification agroécologique et l'agriculture durable (FRC)** vise à contribuer à la formation agricole et au renforcement des capacités pour l'intensification agricole durable et la promotion de l'agroécologie. A travers cette composante, les connaissances sur les techniques et les bonnes pratiques d'intensification agricoles durables et d'agriculture écologiquement intensive sont promues, notamment dans les dispositifs de formation non diplômante des acteurs des filières agricoles.
- **La composante Appui-conseil et vulgarisation des innovations technologiques pour l'intensification agricole durable adaptées aux modes de production des petits producteurs agricoles (ACV)** est destinée à contribuer à l'appui-conseil et à la vulgarisation des innovations technologiques pour l'intensification agricole durable. A travers cette composante les innovations technologiques pour l'intensification agricole durable et adaptées aux modes de production des petits producteurs (et notamment les acquis et recommandations issus de la mise en œuvre des projets de terrain soutenus dans le cadre du Programme) sont vulgarisées auprès des acteurs des filières stratégiques prioritaires notamment le riz, le maïs, le manioc, le mil et le sorgho.
- **La composante Echanges, capitalisation et contribution à l'élaboration de politiques publiques d'intensification agroécologique (ECP)** vise à faciliter les échanges, communiquer, capitaliser les acquis des projets de terrain, des partenariats OPA - centres de recherches - centres de formation et à contribuer à l'élaboration des politiques publiques en faveur de l'agroécologie. A travers cette composante, les expériences sur l'intensification agricole durable et l'agriculture écologiquement intensive sont donc mises en débat, capitalisées, intégrées et promues dans les politiques agricoles notamment le PRIASAN et les PNIASAN. Les résultats des initiatives porteuses, les leçons apprises et leur évaluation en vue d'établir les conditions favorables aux investissements privés pour une agriculture écologiquement intensive et économiquement durable sont diffusés, communiqués et la visibilité des actions pleinement assurée.
- **La composante Coordination et gestion du Programme (CG)** concerne le suivi évaluation, la gestion financière, la coordination des actions internes, nationales et régionales, les appuis divers à l'ARAA et les acquisitions.

La maîtrise d'ouvrage du PAE est assurée par la CEDEAO. Le suivi et la coordination du programme au niveau régional sont assurés par l'Unité de Coordination du Programme (UCP) basée à l'Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA) à Lomé au Togo. Cette unité est appuyée techniquement par le Groupement d'opérateurs AVSF-IRAM-INADES Formation International.

1.2.2 Rappel des principaux résultats attendus et stratégies d'intervention du programme

Quatre (04) principaux résultats sont attendus de la mise en œuvre du programme :

- Les collectifs d'agriculteurs et des communautés rurales sont accompagnés vers une transition agroécologique ;
- Les connaissances sur les techniques et les bonnes pratiques d'agroécologie, d'intensification agricoles durables et d'agriculture écologiquement intensive sont promues dans les dispositifs de formation des acteurs des filières agricoles ;

- Les innovations technologiques pour l'intensification agricoles durables et adaptées aux modes de production des petits producteurs, sont vulgarisées auprès des acteurs des filières stratégiques prioritaires (riz, maïs, manioc, mil/sorgho) ;
- Les expériences sur l'intensification agricole durable et l'agriculture écologiquement intensive en Afrique de l'Ouest sont capitalisées, intégrées et promues dans les politiques agricoles nationales et régionales.

Pour atteindre ces résultats, la stratégie d'intervention du PAE repose sur sept (07) grands principes à savoir : (i) la participation et la responsabilisation des acteurs locaux comme base des interventions du Programme ; (ii) la diversification et la complémentarité des démarches d'appui aux producteurs et aux acteurs locaux à différentes échelles (village, commune ou filière) ; (iii) l'action collective comme approche de co-conception/construction des innovations et comme démarche favorisant leur adoption ; (iv) l'appui-conseil et la diffusion des innovations en tant que principal levier de l'adoption des pratiques et des innovations technologiques en matière d'Agroécologie (AE) et d'intensification agricole durable ; (v) la formation et le renforcement des capacités s'appuyant sur l'existence et le déploiement, au niveau régional, d'un réseau de centres de formation des pratiques AE déjà existantes ou à promouvoir pour permettre à un grand nombre de femmes et de jeunes des milieux ruraux et périurbains, de participer de manière inclusive à la co-construction des connaissances ; (vi) des échanges d'expériences pour produire de nouvelles connaissances et déboucher sur des enseignements plus génériques que ceux tirés de chaque initiative prise individuellement ; (vii) la capitalisation des acquis obtenus ainsi que les leçons tirées des réussites et des échecs facilitant les échanges au niveau local, national et régional et fournissant des éléments utiles aux décideurs pour faire évoluer les politiques publiques.

1.2.3 Zones d'intervention et coût du programme

Le programme couvre les 15 pays membres de la CEDEAO.

Le coût global pour la mise en œuvre du programme est de 16,2 millions d'euros dont 8 millions d'euros financés par l'Agence Française de Développement (AFD) et 8,2 millions par l'Union Européenne (EU). Ces budgets sont exécutés sur la base de planifications annuelles des activités. A cet effet, des plans de travail et budget annuels (PTBA) sont élaborés par l'UCP, les projets de terrains, les Correspondants Nationaux[1] et les partenaires intervenants dans la mise en œuvre du programme (tels que 3AO, les Centres de formation et les Partenariats OPA-CR-CF).

1.3 Faits marquants dans l'environnement du programme

Plusieurs événements majeurs ont marqué la mise en œuvre du Programme en 2024 :

- Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, qui a eu des répercussions significatives sur la mise en œuvre des projets de terrain et sur les activités des Coordinateurs Nationales (CN) dans ces pays ;
- Les problèmes techniques rencontrés par le logiciel de versement de l'AFD, qui ont entraîné un blocage des versements pendant plusieurs mois.

[1]Les Correspondants Nationaux sont les cadres des Ministères en charge de l'agriculture nommés et qui sont chargés de l'organisation des concertations nationales en agroécologie, de la coordination et du suivi rapproché des activités du PAE dans les 15 pays de la CEDEAO.

2 | Etat de mise en œuvre des recommandations du CTS 2023

Pour la mise en œuvre efficace de ses interventions, la CEDEAO, en collaboration avec le CILSS et l'UEMOA, a organisé le comité technique de suivi (CTS) des projets qui permet de valider les rapports annuels et les plans de travail et budget annuel (PTBA) des projets, de traiter de manière détaillée les synergies et les complémentarités avec les autres projet et programmes de l'ECOWAP. A cet effet, s'est tenu du 13 au 21 décembre 2023, à Ouagadougou (Burkina Faso) et en ligne, le Comité technique de suivi des projets et programmes de l'ECOWAP. La réunion du Comité Technique de Suivi (CTS) du Programme Agroécologie s'est tenue le 19 décembre 2023. L'état de mise en œuvre des recommandations formulées au PAE au cours de cette réunion se présente dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Etat de mise en œuvre des recommandations du CTS de décembre 2023

Nr.	Recommandation	Echéance et responsable	Statut	Observations
A l'attention de l'équipe du PAE				
1	Préparer une lettre à soumettre à la signature du DE de l'ARAA pour rappeler les obligations de reporting aux bénéficiaires finaux du PAE	Décembre 2023 – UCP / ARAA	**Réalisé**	
2	Préparer et lancer dès que possible le dossier d'appel à propositions pour la capitalisation transversale	Janvier 2024 – UCP	**Réalisé**	Etude en cours
3	Accélérer la mise en œuvre du MOOC tout en capitalisant les initiatives en cours et assurer une forte communication autour de son lancement		**En cours**	Versement de l'AFD reçu très tardivement
4	Accentuer la pression sur le Consortium qui met en œuvre la stratégie de communication du PAE pour que ce dernier fournisse les livrables attendus	Décembre 2023 – Janvier 2024 – UCP / ARAA	**En cours**	
5	Mentionner clairement dans le reporting les appuis aux centres de formation sur les fonds propres de la CEDEAO	Janvier 2024 – UCP	**Réalisé**	
6	Assurer la finalisation de l'ensemble des audits finaux des projets de terrain	Janvier 2024 - UCP	**Réalisé**	
A l'attention de l'équipe de la CEDEAO				
7	Continuer à appuyer les Centres de formation et le Partenariats sur la recherche participative ainsi que les concertations nationales et les plaidoyers en faveur de l'agroécologie après 2024	Après le projet	N/A	
8	Continuer à appuyer le MOOC Agroécologie après 2024	Après le projet	N/A	
9	Faciliter le versement des fonds au partenariat du Niger	Janvier 2024 – ARAA	**Réalisé**	
A l'attention de l'équipe de l'AFD				
10	Engager dès maintenant la demande versement de la troisième tranche de	Décembre 2023 – Agence de Lomé	**Réalisé**	

	préfinancement auprès de l'UE car il y a déjà un gap de trésorerie sur les comptes du PAIAD			
11	Faire preuve de plus de célérité dans le traitement des demandes d'ANO introduites auprès de l'Agence (4 demandes en cours) ; lettres-avenants aux bénéficiaires pour la prolongation des projets, Gré-à-gré avec le CIRAD, Convention avec le Consortium d'Universités pour le MOOC et la Convention avec le Partenariat du Mali	Décembre 2023 – Agence de Lomé	**Réalisé**	
12	Procéder dans les meilleurs délais au versement des fonds au centre de formation du Mali	Dès réception des fonds de l'UE – Agence de Lomé	**Non réalisé**	Non-signature par le centre de la lettre-avenant pour la prolongation du projet
A l'attention de l'équipe de l'UE				
13	Préparer les termes de référence pour l'évaluation finale du Programme et proposer un calendrier d'exécution de cette étude à l'AFD et la CEDEAO	Fin du premier trimestre 2024 – DUE de Ouagadougou	**Réalisé**	Recrutement des consultants en cours au niveau de l'UE

3 | Exécution physique du projet en 2024

L'état de mise en œuvre des activités programmées en 2024 se présente composante par composante comme suit.

3.1 Composante ATA - Appui à la Transition agroécologique pour les acteurs locaux

3.1.1 ATA.3 - Suivi-évaluation, capitalisation interne et audits des projets de terrain

ATA.3.1 - Finalisation de l'évaluation finale et capitalisation des projets de terrain

La dernière facture du consultant en charge de l'évaluation finale et capitalisation des projets de terrain a été traitée. L'ensemble des livrables, à savoir les notes de capitalisation transversale et les fiches de bonnes pratiques, ont été revus en profondeur par l'UCP pour alimenter le contenu du guide de capitalisation des projets de terrain.

ATA.3.2 - Finalisation des produits de capitalisation

La maquette en version française du guide de capitalisation des projets de terrain, comprenant les 15 fiches de bonnes pratiques est disponible ici : https://app.box.com/s/ptu0v5y2jfymmqpcm8ko7tefbqnu6bi9. Les parties introductives et conclusives doivent être complétées puis le guide sera soumis aux acteurs pour validation et traduit en langue anglaise et portugaise.

Figure 1 : Extraits de la maquette du guide de capitalisation des projets de terrain

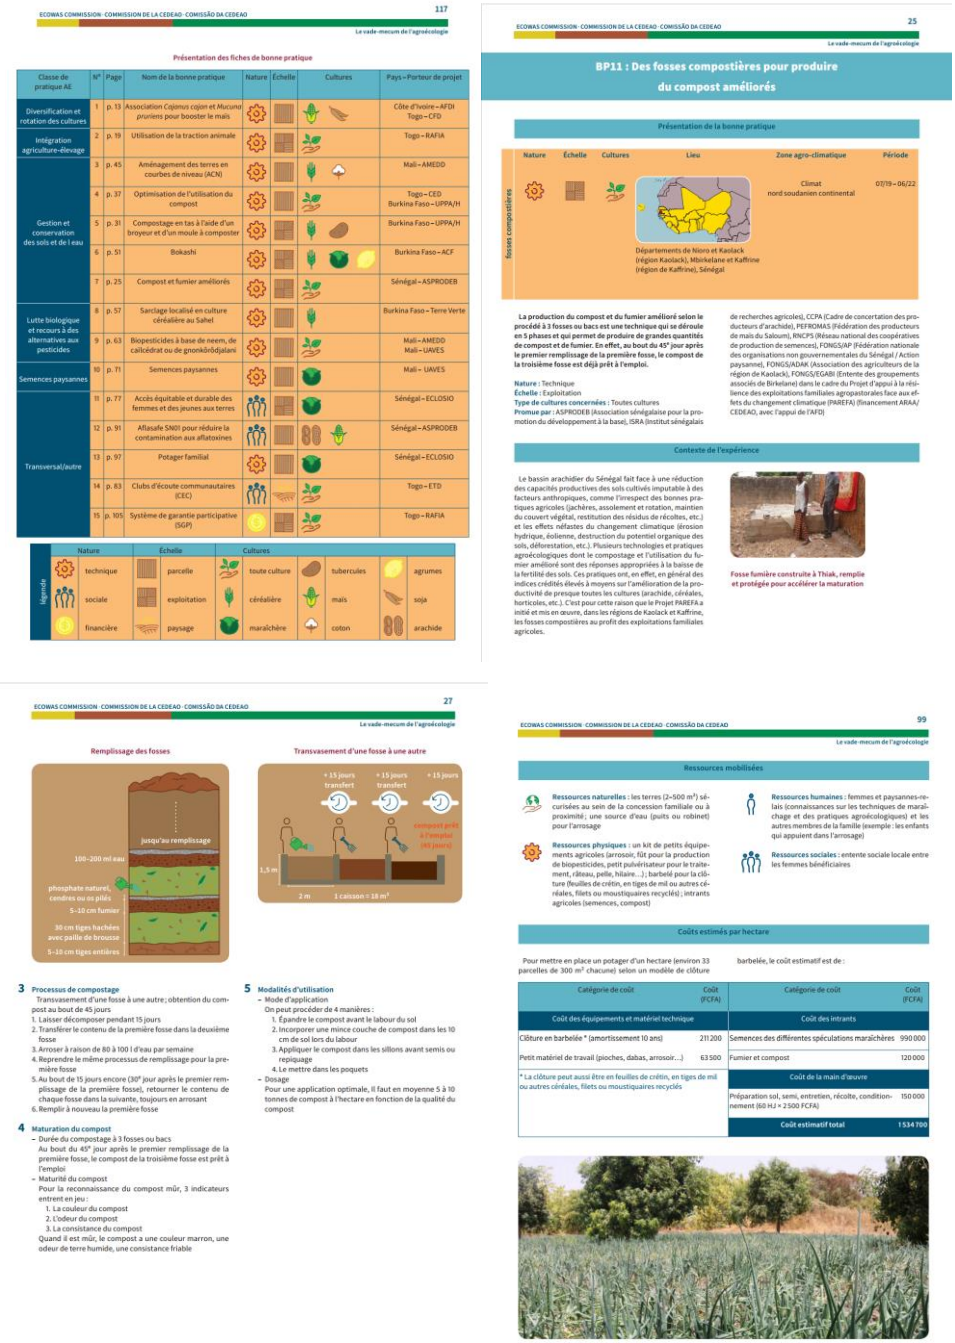

ATA.3.3 - Conduite des audits finaux des projets de terrain

Les 15 rapports d'audits finaux des projets de terrain sont validés par l'UCP ; les versements de reliquats et remboursements de dépenses non réalisées ou non justifiées sont en cours par l'ARAA. Sur un montant de subvention 4 469 209 Euros, 4 186 979 Euros ont été déclaré éligibles, dégageant une économie de 282 230 Euros, dont une partie a déjà été allouée sur d'autres activités.

3.2 Composante FRC - Formation et renforcement des capacités pour l'intensification agroécologique et l'agriculture durable

3.2.1 FRC.2 – Appui au développement des activités des centres de formation

FRC.2.1 - Mise en œuvre des activités des centres formation

La majorité des versements de fonds aux centres de formation ayant été effectué au cours de l'année 2023, l'année 2024 a été consacrée à la mise en œuvre de leurs PTBA validés. L'état des versements aux centres de formation est consigné dans le tableau ci-dessous.

Les lettres-avenants, de prolongation au 14/03/2025, aux Accords de subvention entre la CEDEAO et les centres de formation sont tous signés, hormis celle le Centre d'Apprentissage Agricole (CAA) de Samanko région de Koulikoro du Mali. Le CAA de Samanko par courrier datant du 01/07/2024 a informé l'ARAA qu'il ne peut plus signer la lettre-avenant au regard de la situation entre le Mali et la CEDEAO. Les fonds ne seront donc plus versés au centre.

En résumé, on peut retenir les éléments suivants :

- Tous les centres de formation ont reçu leur 1ère tranche de financement, hormis le centre de formation du Mali (raison politique) et de la Guinée-Bissau (Versement effectué par l'AFD le 09/12/2024 ;n attente de confirmation de réception des fonds) ;
- Sur les 13 centres de formation ayant reçu leur versement, 5 sont en cours d'audit, 4 ont bouclé l'audit de la tranche 1, 2 en attente de déclenchement de l'audit, et 2 n'ont pas atteint le taux d'exécution financière nécessaire pour déclencher l'audit ;
- Trois centres ont déjà reçu la deuxième tranche ;
- Les centres de formation du Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Sierra Leone et Togo ne recevront par leur 2ème tranche, compte tenu des retards dans la mise en place des fonds et le démarrage des activités.

Tableau 2 : État des versements aux centres de formation

Pays	Nom du centre de formation	date de signature de l'AS	Montant total de la subvention (Euros)	Montant de la 1ère tranche (Euros)	Date de versement de la 1ère tranche	Montant de la 2ème tranche (Euros)	Date de versement de la 2ème tranche	Total versé T1+T2	Reste à verser	Économies sur subvention	Observations
Bénin	**TCHARM-FORA**	19/04/2023	100 000	66 600	29/06/2023	33 400	22/11/2024	100 000	0	0	Subvention totale reçue
Burkina - Faso	**Centre de Promotion Rurale (CPR) de Kodougou**	19/04/2023	103 717	80 056	26/06/2023	0		80 056	23 661	0	Audit en cours
Cap Vert	**Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Cruz - CEFPSC**	19/04/2023	88 732	58 313	14/08/2023	0		58 313	0	30 419	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant
Côte d'Ivoire	**Centre de formation GAGNOA-LAKOTA**	19/04/2023	102 078	68 531	26/06/2023	0		68 531	33 547	0	Audit en cours
Gambie	**Pirang Mixed Farming Centre**	19/04/2023	89 950	54 883	17/07/2024	0		54 883	35 067	0	Audit en cours
Ghana	**KUMASI INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE (KITA)**	19/04/2023	105 000	72 000	26/06/2023	0		72 000	0	33 000	Audit en cours Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant

Guinée	**Centre de Vulgarisation et de Formation (CVF) de Bamban**	19/04 /2023	103 814	65 472	06/11 /2023	0		65 472	0	38 342	Audit à déclencher Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant
Guinée Bissau	**Centro de Instrução e Formação Artesanal e Profissional (CIFAP/ MURIALDO-BULA)**	19/04 /2023	89 250	64 774		0		64 774	0	24 476	DV envoyée à l'AFD depuis le 17/11/2023 Paiement effectué par l'AFD depuis le 9/12/2024 En attente de confirmation de réception
Libéeria	**Tumutu Agricultural Vocational Training Centre (TAVTC)**	19/04 /2023	104 822	77 872	26/12 /2023	26 950	18/11 /2024	104 822	0	0	Subvention totale reçue
Mali	**Centre d'Apprentissage Agricole (CAA) de Samanko**	19/04 /2023	104 946			0		0	0	104 946	Ne recevra plus cette subvention DV envoyée à l'AFD depuis le 07/06/2023 Arrêt pour sortie de la CEDEAO
Niger	**Institut Privé de Formation IPF Kaoura-Matameye,**	19/04 /2023	104 756	72 894	26/06 /2023	0		72 894	31 862	0	Audit en cours
Nigéeria	**AGRICULTURAL AND RURAL MANAGEMENT TRAINING INSTITUTE (ARMTI)**	19/04 /2023	104 980	70 667	01/08 /2023	0		70 667	34 313	0	Paiement de la tranche 2 en cours
Sénégal	**La Ferme des 4 chemins,**	19/04 /2023	104 465	74 715	06/11 /2023	29 750	18/11 /2024	104 465	0	0	Subvention totale reçue

Sierra Leone	**University of Makeni Agroecological Training Centre**	19/04 /2023	105 000	77 170	09/09 /2023	0		77 170	0	27 830	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant Audit à déclencher
Togo	**Centre d'Animation Rurale Tambimong Ogaro (CARTO)**	19/04 /2023	104 997	59 083	26/06 /2023	0		59 083	0	45 914	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant Audit en cours
	Total		**1 516 507**	**963 030**		**90 100**		**1 053 130**	**158 450**	**304 927**	

FRC.2.2 - Organisation des missions de suivi-évaluation des activités des centres

Treize (13) missions conjointes de suivi UCP/Backstopping/ARAA et Correspondants Nationaux (CN) ont été conduites en 2024 auprès des centres de formation de la Gambie, Ghana, Guinée, Sierra Leone, Cap Vert, Burkina Faso, Bénin, Libéria, Côte d'Ivoire, Niger, Nigéria, Sénégal et Togo. L'objectif principal de ces missions était d'apprécier les capacités techniques, opérationnelles, administratives et financières du porteur de projet pour mener les activités retenues et de s'assurer que l'ensemble des dispositions nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels de personnel, achats, plan de travail, etc.).

Les aide-mémoires de ces missions de suivi-évaluation sont disponibles sur ce lien : https://app.box.com/s/dabnwtx21tx1giseqtc1u2ep1ceqigft. Le tableau suivant fait état des recommandations spécifiques et transversales des différentes missions de suivi-évaluation : https://app.box.com/s/xljzkb3wrt78s9exoi3v683qlol0z908.

Les activités mises en œuvre par les centres de formation sont résumées dans l'***Annexe 1*** du rapport. De manière générale, on note les principaux résultats suivants depuis le début des projets :

- **Formation de 2 950 apprenants dans les centres, dont 1 423 jeunes (48%)** ;
- **Renforcement des capacités de 263 formateurs en ingénierie de formation et approche agroécologique** ;
- Révision des curricula et des modules de formation des centres afin d'intégrer les approches agroécologiques ;
- Réhabilitation des infrastructures d'accueil et de formation des centres, accompagnée de l'acquisition de matériel pédagogique approprié ;
- Réalisation d'investissements dans les unités pédagogiques de production animale et végétale des centres (sites de démonstration, poulailler, porcherie, bergerie, étable, étangs piscicoles, unité de production de biogaz, apiculture, etc.) ;
- Poursuite des formations sur divers thèmes tels que les associations de cultures, l'agriculture de conservation, la pisciculture intégrée à la riziculture, les techniques de conservation et de gestion de l'eau, la transformation des produits agricoles, l'agribusiness, l'association agriculture-élevage, l'apiculture intégrée à l'agroforesterie, les systèmes de fertilisation par compost et plantes fertilisantes, la production de biopesticides, le séchage des produits à l'énergie solaire, et les jardins agroécologiques.

L'arrêt des activités opérationnelles des centres de formation est prévu pour le 31/12/2924, avec une période de clôture jusqu'au 14/03/2024. Compte tenu des retards accusés dans le versement des fonds, l'unité de coordination du PAE a dû demander aux projets de replanifier et prioriser leurs activités. Ainsi, certains centres ne recevront pas la 2ème tranche de leur financement (Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Sierra Leone et Togo) et certains seront autorisés à poursuivre les activités de mise en œuvre au-delà du 31/12/2024, jusqu'au 14/03/2025.

Figure 2 : Bassins pour le système intégré riz-poisson au centre de formation TAVTC au Libéria

3.2.2 FRC.3 – Appui à l'enseignement supérieur

FRC.3.2 - Adaptation et animation du MOOC Agroécologie en Afrique de l'Ouest

La phase 1 du contrat avec l'Institut Agro pour l'adaptation du MOOC Agroécologie en Afrique de l'Ouest est terminée et le bon de commande de la phase 2 est signé. L'Accord de subvention entre la CEDEAO et le Consortium de neuf (9) universités ouest-africaines a été signé en janvier 2024 mais le 1er versement de l'AFD à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, qui assure le lead du Groupement, n'a été reçu que le 8 octobre 2024, du fait des problèmes techniques de transfert des fonds rencontrés par l'AFD. Une nouvelle planification des activités a été réalisée au-delà de la date de clôture du PAE au 14/03/32024 par le consortium pour tenir compte de la première animation du MOOC. Mais en raison des exigences de la clôture, cette planification a été limitée aux activités réalisables au 14/03/2025. La poursuite des autres activités est prévue dans le cadre du projet DéSIRA+ AO.

Les activités ont démarré avec l'atelier de formation de l'Unité de coordination du MOOC (constitués des représentants des universités) par l'Institut Agro à Montpellier en France, du 9 au 13 décembre 2024. Les autres activités se mènent en ligne avec les responsables de sections. Un atelier de formation des techno-pédagogues est prévu en février 2025 à Parakou au Bénin.

3.3 Composante ACV - Appui-conseil et vulgarisation des innovations technologiques

3.3.1 ACV.1 - Soutien à la mise en place des partenariats entre OPA, centres de recherche et centre de formation

ACV.1.1 - Mise en œuvre des activités de partenariats entre OPA et centres de recherche et de formation et diffusion des résultats de recherche

La majorité des versements de fonds aux projets de partenariats entre les organisations professionnelles agricoles (OPA), les centres de recherche et les centres de formation ayant été effectué au cours de l'année 2023, l'année 2024 a été consacrée à la mise en œuvre de leurs PTBA validés. L'état des versements aux partenariats est consigné dans le tableau ci-dessous.

Les lettres-avenants, de prolongation au 14/03/2025, aux Accords de subvention entre la CEDEAO et les partenariats sont tous signés.

<u>En résumé, on peut retenir les éléments suivants :</u>

- Tous les partenariats ont reçu leur 1ère tranche de financement, hormis les partenariats du Cap Vert (non formation du partenariat) et du Mali (blocage politique) qui n'ont pas signé d'Accord de subvention ;
- Sur les 13 partenariats ayant reçu leur versement, 5 ont finalisé l'audit, 2 sont en cours d'audit, , et 6 n'ont pas atteint le taux d'exécution financière nécessaire pour déclencher l'audit ;
- Cinq partenariats ont déjà reçu leur deuxième tranche (Côte d'ivoire, Bénin, Burkina, Ghana et Guinée Bissau) ;
- Les partenariats du Togo, Niger, Sénégal, Gambie, Sierra Leone et Guinée ne recevront par leur 2ème tranche, compte tenu des retards dans la mise en place des fonds et le démarrage des activités.

Tableau 3 : État des versements aux partenariats

Pays	Nom du porteur de projet	Montant total de la subvention (Euros)	Montant de la 1ère tranche (Euros)	Date de versement de la 1ère tranche	Montant de la 2ème tranche (Euros)	Date du 2ème versement	Montant Total versé	Reste à verser	Économies par rapport à l'AS signé	Observations
Bénin	**FUPRO : Fédération des Unions de Producteurs du Bénin**	50 000	34 923	10/08/2023	15077,00	05/11/2024	50000,00	0	0	Subvention totale reçue
Burkina Faso	**ARFA : Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie**	50 000	31 169	02/11/2023	18831,00	07/11/2024	50000,00	0	0	Subvention totale reçue
Cap Vert	**NA**	-	-				0,00	0	0	AS non signé
Côte d'Ivoire	**AGRINNOV**	50 000	32 180	10/08/2023	17820,00	19/08/2024	50000,00	0	0	Subvention totale reçue
Gambie	**DoA (Departement of Agriculture): Ministry of Agriculture (MoA)**	50 000	35 000	14/12/2023	0,00		35000,00	0	15 000	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant
Ghana	**CNTA: Centre for No-Till Agriculture**	50 000	34 150	22/08/2023	15850,00	02/12/2024	50000,00	0	0	Subvention totale reçue
Guinée	**IRAG : Institut de la Recherche Agronomique de Guinée**	50 000	35 000	14/12/2023	0,00		35000,00	0	15 000	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant
Guinée Bissau	**AS: Associação Asas de Socorro**	50 000	28 951	02/11/2023	21049,00	19/12/2024	50000,00	0	0	Subvention totale reçue
Liberia	**AfricaRice, Suakoko, Bong County**	50 000	34 725	26/10/2023	0,00		34725,00	15 275	0	Audit en cours

Mali	**FENABE (Fédération Nationale des Producteurs de l'Agriculture Biologique et Ecologique).**		-				0,00	0	0	AS non signé
Niger	**INRAN : Institut National de la recherche Agronomique du Niger**	50 000	39 925	13/03/2023	0,00		39925,00	0	10 075	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant
Nigeria	**Institute for Agricultural Research (IAR), Ahmadu Bello University**	50 000	38 797	09/02/2024	0,00		38797,00	0	11 203	Audit en cours
Sénégal	**CNCR : Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux :**	50 000	35 000	22/12/2023	0,00		35000,00	0	15 000	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant
Sierra Leone	**Planning Evaluation Monitoring and Statistics Division (PEMSD). Ministry of Agriculture and Food Security, Sierra Leone**	50 000	35 000	16/01/2024	0,00		35000,00	0	15 000	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant
Togo	**ITRA : Institut Togolais de Recherche Agronomique**	50 000	34 395	02/11/2023	0,00		34395,00	0	15 605	Ne recevra plus cette dernière tranche car n'a pas pu consommer la T1 à tant
	TOTAL	**650 000**	**449 215**		**88 627**		**537 842**	**15 275**	**96 883**	

ACV.1.2 - Organisation des missions de suivi-évaluation des activités des projets de Partenariat OPA

Treize (13) missions conjointes de suivi UCP/Backstopping/ARAA et Correspondants Nationaux (CN) ont été conduites en 2024 auprès des partenariats de Gambie, Ghana, Guinée, Sierra Leone, Burkina Faso, Bénin, Libéria, Côte d'Ivoire, Niger, Guinée-Bissau, Nigéria, Sénégal et Togo. L'objectif principal de ces missions était d'apprécier les capacités techniques, opérationnelles, administratives et financières du porteur de projet pour mener les activités retenues et de s'assurer que l'ensemble des dispositions nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels de personnel, achats, plan de travail, etc.).

Les aide-mémoires de ces missions de suivi-évaluation sont disponibles sur ce lien : https://app.box.com/s/dabnwtx21tx1giseqtc1u2ep1ceqigft. Le tableau suivant fait état des recommandations spécifiques et transversales des différentes missions de suivi-évaluation : https://app.box.com/s/xljzkb3wrt78s9exoi3v683qlol0z908.

Les activités mises en œuvre par les partenariats sont résumées dans l'***Annexe 2*** du rapport. De manière générale, on note les principaux résultats suivants depuis le début des projets :

- Mis en place des dispositifs de co-expérimentation des innovations avec les producteurs ;
- Adaptation et/ou capitalisation de nombreuses innovations techniques agroécologiques ont été adaptées et/ou capitalisées, telles que la production de semences de plantes fertilisantes, la promotion des semences paysannes, les rotations et cultures associées, les techniques améliorées de compostage, l'intégration riz-poissons et maraichage, la production de biopesticides, etc.
- **Formation de 6 630 producteurs aux pratiques agroécologiques** ;
- Production de divers outils de diffusion des pratiques (fiches techniques, vidéos, etc.) ;
- Organisation de visites d'échanges avec les producteurs pour partager les expériences et renforcer les connaissances.

L'arrêt des activités opérationnelles des partenariats est prévu pour le 31/12/2924, avec une période de clôture jusqu'au 14/03/2024. Compte tenu des retards accusés dans le versement des fonds, les projets ont dû replanifier et prioriser leurs activités, certains ne recevront probablement pas la 2ème tranche de leur financement (Togo, Niger et Sénégal) et certains seront autorisés à poursuivre les activités de mise en œuvre au-delà du 31/12/2024, jusqu'au 14/03/2025.

Figure 3 : Récolte du manioc dans un champ école paysan du partenariat de Côte d'Ivoire – rendement obtenu de 57,6 t/ha (association et rotations culturales imbriquées avec la jachère de courte durée de Mucuna et Cajanus (plantes fertilisantes)

3.3.2 ACV.2 - Renforcement des capacités et appui méthodologiques aux dispositifs de vulgarisation

ACV.2.1 - Formation des agents des systèmes nationaux de vulgarisation

Cette activité est directement exécutée par les Correspondants nationaux, à travers l'organisation des sessions de formation des agents des systèmes nationaux de vulgarisation sur l'agroécologie, l'agriculture intensive durable. Sur l'année, certains pays ont pu organiser les sessions de formation, mais globalement la non-disponibilité des fonds due aux problèmes techniques rencontrés par l'AFD bloque la mise en œuvre des PTBA des CN.

Au total, depuis le début du projet, **331 agents de vulgarisation nationaux**, ont été formés sur l'agroécologie.

Pour plus de détail sur les activités mises en œuvre par les CN, se référer à l'***Annexe 3*** du rapport.

ACV.2.2 - Consolidation des plateformes d'échanges sur le conseil agricole

Dans le cadre des efforts de mise en place de synergies en matière de conseil en agroécologie à l'échelle régionale, le Contrat de Prestation de Service (CPS) avec le CIRAD pour l'appui au Réseau de Service du Conseil Agricole et Rural d'Afrique de l'Ouest et du Centre (RESCAR-AOC) dans le cadre du projet ACOTAF a été signé le 26 février 2024. Une étude est en cours en vue de (i) l'implantation et la dynamisation des plateformes d'échanges entre les acteurs de conseil ; (ii) la consolidation des

connaissances et des recommandations pour le développement du conseil en agroécologie et ; (iii) l'organisation des apprentissages et d'un dialogue stratégique pour le renouvellement du conseil agricole en Afrique de l'Ouest. Cette étude est complémentaire de celle réalisée dans le cadre du projet ACOTAF qui a permis d'identifier les leviers du conseil en agroécologie dans les pays couverts par ce projet. Elle étend l'étude d'ACOTAF sur les pays anglophones et lusophones à travers un échantillon constitué du Nigeria, du Ghana et de la Guinée-Bissau.

Les livrables provisoires des études au Nigéria, Ghana et Guinée-Bissau ont été reçus par l'UCP qui a transmis ses commentaires au CIRAD pour prise en compte.

3.4 Composante ECP - Echanges, capitalisation et contribution à l'élaboration de politiques publiques d'intensification agroécologique

3.4.1 ECP.1 - Mise en place d'un réseau régional et de dispositifs d'échanges

ECP.1.2 – Appui à la plateforme 3AO

Le PAE a poursuivi le renforcement des capacités de l'Alliance pour l'Agroécologie en Afrique de l'Ouest (3AO) avec qui elle a signé un MoU en 2021. En 2024, les principales actions mises en œuvre dans le cadre du PTBA de 3AO sont les suivantes :

- La préparation et la tenue du forum régional sur l'agroécologie et l'agriculture biologique du 21 au 24 octobre 2024 à Abuja, co-organisée par l'Alliance 3AO et le West African Organic network (WAfrOnet) en collaboration avec Action Aid Nigéria et la CEDEAO à travers les projets PAIAD, AIC et FVC. Le forum sur le thème « *Financer la transformation des systèmes alimentaires et nutritionnels durables pour la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest à travers l'agroécologie et l'agriculture biologique : quels politiques, mécanismes et instruments ?* », a regroupé près de 400 participants issues des réseaux d'OP, d'OSC et structures membres de 3AO et de WAfrONet, des institutions techniques et d'intégration régionale et continentale, des institutions de financement nationale, régionales et internationales, des coopérations bilatérales et multilatérales, des institutions nationales et régionales de recherche et des ONG et les représentants des ministères en charges de l'agriculture, de l'environnement et des finances des Etats membres. Le rapport est en cours d'élaboration ; et
- Les formations agricoles via l'université paysanne se sont poursuivies et ont permis d'élaborer des projets de recherches par les participants ; ces formations se déroulées de façon alternée (cours théoriques et pratiques sur le terrain) ;
- La finalisation et le lancement, en marge du Forum sur l'agroécologie à Abuja, de la plateforme numérique de partage d'informations et de connaissances entre chercheurs, OP et partenaires, avec l'appui technique et financier du projet FAIR Sahel dans le cadre des synergies avec le PAE, et le recrutement du prestataire pour l'animation de la plateforme. La plateforme est accessible ici : https://www.3aohub.org/fr/1/home.html.

Figure 4 : Photo de famille du forum sur l'agroécologie et l'agriculture biologique à Abuja

ECP.1.3 – Participation des CN aux réunions régionales de concertation

Les CN ont participé au forum sur l'agroécologie et l'agriculture biologique organisée par la plateforme 3AO et WAfRONet, du 21 au 24 octobre 2024 à Lomé.

3.4.2 ECP.2 - Appui au processus de capitalisation des résultats obtenus et diffusion des « bonnes pratiques »

ECP.2.1 – Recrutement d'un consultant en appui au processus de capitalisation transversale

La capitalisation transversale a pour **premier objectif** de partager, valoriser les expériences, actions et innovations (que ce soit dans le domaine technique, méthodologique ou organisationnel) du programme auprès des acteurs du développement, en tirant les leçons, c'est-à-dire les résultats et impacts plus ou moins importants, les processus de mise en œuvre, les potentialités et conditions (facteurs limitants et favorables) de développement et de durabilité. La connaissance de ces expériences, actions et innovations et les leçons tirées (et notamment les conditions de mise en œuvre et de développement) permettent de répondre à un **second objectif**, celui d'alimenter un plaidoyer au service de politiques régionales et nationales (notamment PRIASAN et PNIASAN) en faveur du développement de l'agroécologie, en précisant notamment les mesures incitatives pouvant être mises en place. C'est pourquoi, les **bénéficiaires de la capitalisation** seront tout à la fois les praticiens du développement, les organisations professionnelles agricoles (acteurs du développement), les acteurs de la recherche, les centres de formation et les pouvoirs publics régionaux, nationaux et locaux (en charge de la définition et

de la mise en œuvre de politiques publiques), auxquels s'ajoutent les organismes de coopération internationale susceptibles de soutenir des actions à différents niveaux (initiatives privées et publiques). Les bénéficiaires constituent également des contributeurs du processus de capitalisation, grâce à des étapes de mise en débat et d'enrichissement des résultats provisoires.

La demande de propositions pour le marché de capitalisation transversale a été envoyée le 28 février 2024 aux bureaux d'étude de la liste restreinte. L'évaluation technique et financière a été menée et a abouti à l'attribution du marché au groupement LARES-GRET-Inter-réseaux, soumise à l'approbation de l'AFD le 25 juin 2024. Le contrat a été signé et les deux premères étapes de l'étude, à savoir l'étape de cadrage et la phase exploratoire ont été complétées. Les deux premiers livrables de l'étude, validés par le Comité technique de suivi de l'étude, sont disponibles ici : https://app.box.com/s/w038hg212ylswyhyrkvxf5nx8lsfz76c.

La phase de terrain est en cours et le 3ème Comité technique de suivi est prévu pour le 2 février.

Les sept (7) thématiques de la capitalisation retenues sont les suivantes :

a. Partenariats innovants ;
b. Intrants et équipements pour la transition agroécologique ;
c. Marchés territoriaux des produits agroécologiques ;
d. Formation professionnelle et insertion des jeunes dans les systèmes agroécologiques ;
e. Cadres de concertation multi-acteurs pour l'inclusion de l'agroécologie dans les politiques publiques ;
f. Recherche participative, dispositifs d'appui-conseil, cocréation de connaissances et d'innovations agroécologiques adaptées aux besoins des producteurs ; et
g. Systèmes d'élevage agroécologiques.

La thématique « Mécanismes de financement » sera quant-à-elle abordée de façon transversale dans le cadre du traitement des autres thématiques. Dans le cadre du traitement des différentes thématiques, une attention sera également portée aux éventuels aspects relatifs à l'évaluation des systèmes et pratiques agroécologiques, de façon à les intégrer si besoin dans les conclusions générales.

Les pays à visiter pour la phase terrain sont les suivants : Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Sénégal et Togo.

Figure 5 : Aperçu général du programme provisoire de travail de la capitalisation transversale

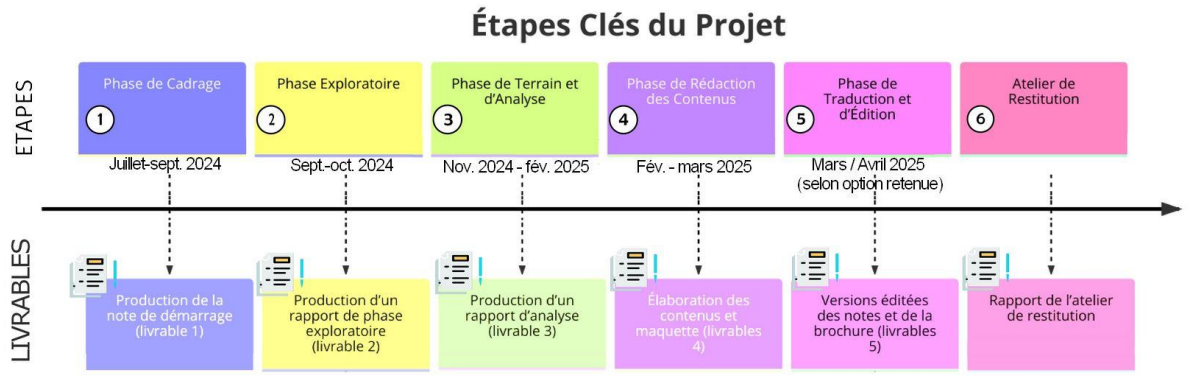

ECP.2.2 – Poursuite de la mise en œuvre des actions de communication/visibilité et diffusion des résultats

En 2024, les activités de communication se sont poursuivi avec l'appui du consultant, notamment en lien avec la capitalisation et la diffusion des acquis du PAE, à savoir :

- L'édition et la diffusion de 3 Newsletters sur l'agroécologie, autour des thèmes suivants :
  - « Vers une transformation agroécologique des systèmes agricoles et alimentaires » (N°5 / décembre 2023) : https://ecowap.ecowas.int/see-document/463
  - « De l'importance de mobiliser des ressources pour la transition agroécologique dans la CEDEAO » (N°6 / avril 2024) : https://ecowap.ecowas.int/see-document/467
  - « Investir dans la formation et la recherche participative pour la sécurité alimentaire durable » (N°7 / août 2024) : https://ecowap.ecowas.int/see-document/483
- L'édition de la maquette du guide de capitalisation des projets de terrain ;
- La finalisation et la diffusion des 3 capsules vidéo sur les réseaux sociaux de l'ARAA et de la DADR (chaine Youtube, Facebook, Twitter) et les listes de diffusion de l'ARAA :
  - Vidéo institutionnelle du PAE - 8 min : https://www.youtube.com/watch?v=K3XzVKS12OU
  - Les Clubs d'Ecoute Communautaire (CEC) – 5 min : https://www.youtube.com/watch?v=OZZzIcoO7nU
  - Le Bokashi : https://www.youtube.com/watch?v=faJGMH8cpLw&t=158s

Figure 6 : Pages de couvertures des Newsletters de l'agroécologie

ECP.2.3 – Production et diffusion des spots radio

Les spots radios élaborés par le cabinet de communication ont été remis en français, anglais et portugais aux CN le 31/01/2024 et certains pays ont pu assurer la traduction des spots en 3 langues locales et leur diffusion sur les radios nationales. Toutefois, cette activité est en souffrance dans les pays où les CN n'ont pas encore reçu les fonds, du fait des problèmes techniques de transfert rencontrés par l'AFD.

3.4.3 ECP.3 - Mise en place et animation des cadres de concertation nationaux et plaidoyer

Les CN ont organisé en 2024 des réunions de leurs cadres de concertations nationales et des partenariats autour des transitions agroécologiques pour l'identification des thématiques pouvant alimenter les politiques publiques. Mais en raison du retard accusé dans la mise en place des fonds par l'AFD, certains CN n'ont pas pu dérouler les activités programmées en 2024 conformément à leurs planifications.

De manière générale, on note les principaux résultats suivants sur les cadres de concertations nationaux (CCN) depuis le début du programme :

- Formulation et validation des plans d'actions et des chartes de fonctionnement des CCN (hormis Guinée-Bissau, Libéria, Mali et Niger / Cap Vert : documents en attente de validation) - **au total, 10 cadres de concertation mis en place** ;
- Organisation des réunions du CCN pour débattre de thématiques pouvant alimenter et faire évoluer la prise en compte de l'agroécologie dans les politiques publiques – **au total, 35 réunions des cadres de concertation tenues** ;
- Plusieurs mesures émergeant de ces cadres adoptés par les pouvoirs publics comme l'organisation d'une semaine nationale de l'agroécologie au Bénin, la création de champons nationaux de l'agroécologie au Ghana, l'adoption d'une stratégie nationale sur le développement de l'agriculture écologique et biologique et au Bénin, ou encore la mise en place d'une subvention des engrais organique par l'Etat du Sénégal au profit des acteurs de l'agroécologie.

Les activités mises en œuvre par les CN sont résumées dans l'***Annexe 3*** du rapport.

3.4.4 ECP.4 - Appui à la mise en place du PRIASAN et des PNIASAN et financement de l'agroécologie

La principale activité a concerné l'organisation du 25 au 29 octobre 2024 à Abuja, en marge du forum sur l'agroécologie et l'agriculture biologique, d'un Atelier régional de renforcement de capacités à l'accès au fonds climat au profit des Experts régionaux et nationaux de quinze (15) pays membres de la CEDEAO sur la thématique de « la formulation des projets et l'accès au financement climatique pour la résilience du secteur agricole ». La formation était co-financée par le Programme agroécologie (PAE), le Projet de renforcement des capacités institutionnelles de la CEDEAO et des Etats à l'accès au financement climat pour soutenir la stratégie régionale climat (Readiness FVC) et le Projet régional de promotion d'une agriculture intelligente face au climat (AIC) en Afrique de l'Ouest. L'objectif de l'atelier était de présenter les méthodes et procédures d'accès et de préparation des projets aux Fonds climatiques, tout en mettant en évidence les éléments clés de l'ingénierie climatique pour le secteur agricole.

Figure 7 : Photo d'une session de la formation sur la finance climat

3.5 Composante CG - Coordination et Gestion du Programme

3.5.1 CG.1 - Appui à la maitrise d'ouvrage dans la coordination et la gestion courante du PAE

La gestion courante du Programme se poursuit malgré les difficultés posées par les problèmes de transferts des fonds aux partenaires dans les pays. Les requêtes faites par l'UCP à l'AFD pour permettre les transferts des fonds par l'ARAA à partir des fonds disponibles sur les comptes PATAE et PAIAD n'ont toujours pas reçu de réponses favorables.

En 2024, l'équipe de l'UCP a contribué/participé aux réunions régionales suivantes :

- Appui à l'ARAA pour l'organisation de la réunion annuelle des Comités de pilotage thématiques des projets et programme de l'ECOWAP (avril 2024 – Lomé, Togo) et contribution à l'élaboration de la note thématique « Changements Climatiques et Agroécologie » ;
- Participation à la formation sur MESECOPS-Kobo et la gestion informatique des appels à proposition de l'ARAA organisée du 1er au 06 juin 2024 à Agbodrafo au Togo ;
- Participation de l'UCP à la Retraite de l'ARAA du 28 au 1er août 2024 à Aného au Togo ;
- Participation à la conférence internationale de DéSIRA Lift du 23 au 27 septembre 2024 à Accra au Ghana ;
- Appui à l'ARAA pour l'organisation de la réunion annuelle des Comités Technique de Suivi des projets et programmes.

Les lettres-avenants de prolongation au 14/03/2025 aux Accords de subvention entre la CEDEAO et les porteurs de projets sont tous signés, hormis celle du centre de formation du Mali. De même, les lettres-avenants avec les Ministères de l'Agriculture des pays sont toutes signés, hormis celles du Mali, Burkina Faso et Niger.

Concernant le projet DeSIRA+AO, la Convention de contribution entre l'UE et l'AFD pour le projet DesiRA+AO a été signée le 3 juillet 2024, son enregistrement est en cours dans OPSYS et les documents pour la levée des conditions suspensives sont en cours de préparation.

La Convention entre l'AFD et la CEDEAO a reçu l'avis favorable des services juridiques de la CEDEAO le 26 août 2024. L'AFD a officiellement transmis le document au Président de la Commission le 18 octobre 2024. La Convention a été signée le 25 novembre 2024.

Concernant la mise en œuvre du Projet, bien que la Convention ne soit pas encore signée, certaines activités ont été anticipées :

- Recrutement de l'assistance technique : cette activité a été initiée en janvier 2024. La proposition de contrat à signer entre la CEDEAO et le Groupement IRAM-AVSF-INADES a reçu l'ANO de l'AFD le 16 septembre 2024 et le contrat a été signé le 19 décembre 2024.
- Le PTBA pluriannuel, le plan de passation de marchés pluriannuel, ainsi que le plan de décaissement ont été élaborés et le PPM a obtenu l'ANO de l'AFD le 7 octobre 2024.
- Le recrutement des panélistes qui évalueront l'appel à projets a été lancé le 7 novembre 2024.
- Les termes de référence des postes de l'URC ont été élaborés par l'ARAA et la DADR et envoyés à l'AFD pour avis de non-objection le 28 octobre 2024.
- En parallèle, d'autres documents sont en cours d'élaboration tels que la version provisoire du document d'appel à projets, la version provisoire du manuel de procédures du projet, divers tableaux de bords et outils de suivi.

3.5.2 CG.2 - Suivi-Evaluation

Les activités réalisées de suivi-évaluation en 2024 ont concerné :

- L'appui aux CN et aux porteurs des projets terrains pour la mise en œuvre efficace des activités ;
- L'organisation des missions de suivi-évaluation auprès de certains centres de formation et des partenariats OPA ;
- Mission de pré audit dans les trois pays de l'AES en vue de préparer la clôture des comptes des Correspondants nationaux du PAE suite à la non-signature par les ministres en charge de l'agriculture, des lettres-avenants à la convention dans ces pays ;
- Le suivi des différents marchés et les processus de contractualisation ;
- L'élaboration du PTBA global 2025 consolidé ;
- L'élaboration de deux rapports trimestriels, d'un rapport semestriel et du rapport annuel d'activités 2024 pour le CTS ;
- La participation aux réunions des Comités régionaux de Pilotage (CoPil) thématiques et des Comités Techniques de Suivi (CTS) des projets/programmes de l'ECOWAP ;
- L'élaboration du rapport du CoPil (et du CTS du PAE) ;
- L'organisation des réunions de coordination pour la mise en œuvre efficace des activités ;
- La mise à jour des informations sur le système de suivi-évaluation de l'ARAA, MESECOPS ;
- Le renseignement des indicateurs du cadre logique sur MESECOPS et sur le système de suivi-évaluation de l'UE (OPSYS) est en attente, en attente du retour de la délégation de l'U pour

Le rapport de la réunion du CTS qui s'est tenue le 25 novembre 2024 est disponible ici : https://app.box.com/s/c0mchhxwo67ghe3noagabty6z686jml0.

La mission annuelle d'appui du backstopping du Groupement d'opérateurs auprès de l'UCP s'est déroulée du 10 au 13 juin 2024. Le compte-rendu de mission est disponible ici : Aide-Mémoire mission BkS Lome_juin2024.pdf). Cette mission a permis de :

- Faire le point des premières missions de suivi-évaluation des projets effectuées et définir les stratégies pour accompagner les projets à atteindre les résultats espérés et à achever les actions au 31/12/2024 ;
- Faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Programme dans son ensemble au regard des défis (date d'achèvement technique 14/03/2025) ;
- Échanger sur les activités de la capitalisation transversale et du conseil en agroécologie ; et
- Examiner les niveaux d'exécution des activités par composante et la gestion budgétaire, comptable et financière du Programme et renforcer les capacités de l'UCP pour une clôture efficace et efficiente en 2025.

Enfin, l'UE a lancé le processus d'évaluation finale en transmettant les termes de référence à l'AFD. L'AFD a soumis les commentaires consolidés de l'AFD et de la CEDAO à la DUE Ouaga fin juin. L'UE devrait recruter le consultant au premier trimestre 2025.

3.5.3 CG.3 - Audits et appuis à l'ARAA

Les principales activités réalisées en 2024 ont concerné :

- L'audit des deux comptes du PAE à l'ARAA (comptes PATAE-ARAA et PAIAD-ARAA) de l'année 2023 ont été conduits et les rapports finaux validés ; et
- L'appui à la réalisation des différents audits des CN, centres de formation, partenariats OPA-CR-CF et de 3AO ayant atteint au moins 70 % de consommation des tranches reçues précédemment.

En raison de la non-signature des avenants aux Accords de subvention par les trois pays de l'AES, une mission de pré-audit a été menée par l'UCP auprès des Correspondants nationaux des ministères de l'agriculture concernés pour préparer la clôture des comptes. A l'issue de cette mission le processus de déclenchement des audits est en cours. La non-signature des avenants aux accords de subvention par ces trois pays permet de dégager une économie correspondant aux montants des PTBA 2024 initialement prévus pour ces pays soit en 265 803 Euros.

3.6 Synthèse des réalisations physiques

L'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées dans le PTBA 2024 a permis d'apprécier le niveau d'exécution par composante. Pour cela, un calcul des taux de réalisation des extrants a été réalisé à partir des extrants obtenus par rapport à l'ensemble des extrants attendus, depuis le système de suivi-évaluation de l'ARAA, MESECOPS.

Au 31 décembre 2024, le taux d'exécution physique du PTBA 2024 est estimé à 78%. Par composante, les taux d'exécution physique varient de 94% pour la composante ATA à 72% pour la composante FRC (retard dans le lancement des activités du MOOC) et 50% pour la composante ECP (report de l'atelier final à 2025) comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 8 : Taux d'exécution des activités programmées en 2024 par composante

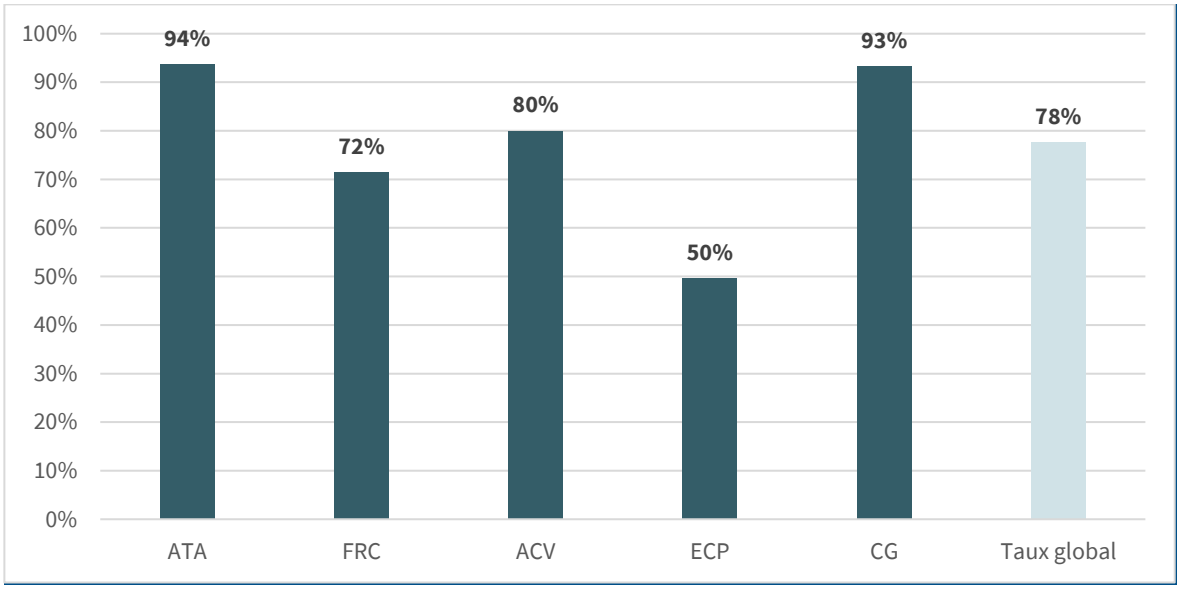

4 | Exécution budgétaire du projet en 2024

4.1 Exécution financière du PTBA 2024

Le budget total du PTBA 2024 du PAE s'élevait à 6 073 628 ,75 € dont 1 217 826,56 € pour le PATAE et 4 885 802,19 € sur les fonds PAIAD. Le total des montants décaissés par l'AFD au profit des différents partenaires pour la mise en œuvre du PTBA 2024 représente 53 % du budget.

4.1.1 Etats des décaissements faits par l'AFD

Tableau 4 : Taux de décaissement par l'AFD du budget du PTBA

Composantes	Budget du PTBA 2024			Décaissements faits par l'AFD			Taux de décaissement		
Activités	AFD / PATAE	UE / PAIAD	TOTAL	AFD / PATAE	UE / PAIAD	TOTAL	AFD / PATAE	UE / PAIAD	TOTAL
ATA	**361 133,34 €**	**- €**	**361 133,34 €**	**120 269,80 €**	**- €**	**120 269,80 €**	**33%**		**33%**
ATA.1	- €	- €	- €						
ATA.2	297 016,66 €	- €	297 016,66 €	120 269,80 €		120 269,80 €	40%		40%
ATA.3	64 116,68 €	- €	64 116,68 €			- €	0%		0%
FRC	**- €**	**1 634 930,31 €**	**1 634 930,31 €**		**917 672,94 €**	**917 672,94 €**		**56%**	**56%**
FRC.1	- €	- €	- €		1 524,49 €	1 524,49 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FRC.2	- €	1 463 981,31 €	1 463 981,31 €		587 936,65 €	587 936,65 €		40%	40%
FRC.3	- €	170 949,00 €	170 949,00 €		328 211,80 €	328 211,80 €		192%	192%
ACV	**- €**	**983 936,96 €**	**983 936,96 €**		**400 428,95 €**	**400 428,95 €**		**41%**	**41%**
ACV.1		655 377,53 €	655 377,53 €		4 151,36 €	4 151,36 €		1%	0,63%
ACV.2		328 559,42 €	328 559,42 €		396 277,59 €	396 277,59 €		121%	121%
ECP	**642 585,22 €**	**1 368 242,29 €**	**2 010 827,51 €**	**356 190,24 €**	**695 959,13 €**	**1 052 149,36 €**	**55%**	**51%**	**52%**
ECP.1	303 698,20 €	48 891,15 €	352 589,36 €	288 264,53 €	13 811,77 €	302 076,29 €	95%	28%	86%
ECP.2	45 734,71 €	312 558,44 €	358 293,14 €	3 506,33 €	138 074,70 €	141 581,03 €	8%	44%	40%
ECP.3	273 112,41 €	708 347,90 €	981 460,31 €	47 716,54 €	540 072,66 €	587 789,20 €	17%	76%	60%
ECP.4	20 039,90 €	298 444,80 €	318 484,70 €	16 702,84 €	4 000,00 €	20 702,84 €			
CG	**214 108,00 €**	**649 459,00 €**	**863 567,00 €**	**91 698,02 €**	**412 439,27 €**	**504 137,29 €**	**43%**	**64%**	**58%**
CG.1	122 108,00 €	549 459,00 €	671 567,00 €	91 698,02 €	402 439,27 €	494 137,29 €	75%	73%	74%
CG.2	- €	- €	- €			- €			
CG.3	92 000,00 €	100 000,00 €	192 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	0%	10%	5%
DI			**- €**						
EA			**- €**						
FG		**219 233,64 €**	**219 233,64 €**		**219 233,64 €**	**219 233,64 €**			
Total général	**1 217 826,56 €**	**4 855 802,19 €**	**6 073 628,75 €**	**568 158,06 €**	**2 645 733,91 €**	**3 213 891,97 €**	**47%**	**54%**	**53%**

4.1.2 Engagements contractuels additionnels de 2024

En 2024, les engagements contractuels additionnels s'élèvent à **192 610,00 €** et correspondent au montant du contrat signé entre la CEDEAO et le groupement LARES-GRET - Inter Réseaux développement Rural pour la réalisation de l'étude de capitalisation transversale.

4.1.3 Dépenses justifiées de 2024

Le taux d'exécution budgétaire du PTBA 2024 est de 52% au 31/12/2024

Tableau 5 : Taux de dépenses justifiées par activité du PTBA 2024

Composantes	Budget du PTBA 2024			Dépenses justifiées			Taux de dépenses justifiées		
Activités	AFD / PATAE	UE / PAIAD	TOTAL	AFD / PATAE	UE / PAIAD	TOTAL	AFD / PATAE	UE / PAIAD	TOTAL
ATA	**361 133,34 €**	**- €**	**361 133,34 €**	**116 524,36 €**	**- €**	**116 524,36 €**	**32%**		**32%**
ATA.1	- €	- €	- €			- €			
ATA.2	297 016,66 €	- €	297 016,66 €	70 462,63 €		70 462,63 €	24%		24%
ATA.3	64 116,68 €	- €	64 116,68 €	46 061,73 €		46 061,73 €	72%		72%
FRC	**- €**	**1 634 930,31 €**	**1 634 930,31 €**	**- €**	**750 573,08 €**	**750 573,08 €**		**46%**	**46%**
FRC.1	- €	- €	- €		17 024,19 €	17 024,19 €			
FRC.2	- €	1 463 981,31 €	1 463 981,31 €		672 268,10 €	672 268,10 €		46%	46%
FRC.3	- €	170 949,00 €	170 949,00 €		61 280,79 €	61 280,79 €		36%	36%
ACV	**- €**	**983 936,96 €**	**983 936,96 €**	**- €**	**451 338,32 €**	**451 338,32 €**		**46%**	**46%**
ACV.1	- €	655 377,53 €	655 377,53 €		313 601,52 €	313 601,52 €		48%	48%
ACV.2	- €	328 559,42 €	328 559,42 €		137 736,80 €	137 736,80 €		42%	42%
ECP	**642 585,22 €**	**1 368 242,29 €**	**2 010 827,51 €**	**123 624,53 €**	**649 420,36 €**	**773 044,89 €**	**19%**	**47%**	**38%**
ECP.1	303 698,20 €	48 891,15 €	352 589,36 €	- 8 000,66 €	54 404,37 €	46 403,71 €	-3%	111%	13%
ECP.2	45 734,71 €	312 558,44 €	358 293,14 €	26 319,12 €	151 343,37 €	177 662,49 €	58%	48%	50%
ECP.3	273 112,41 €	708 347,90 €	981 460,31 €	105 229,85 €	371 500,34 €	476 730,19 €	39%	52%	49%
ECP.4	20 039,90 €	298 444,80 €	318 484,70 €	76,22 €	72 172,28 €	72 248,51 €	0%	24%	23%
CG	**214 108,00 €**	**649 459,00 €**	**863 567,00 €**	**229 234,55 €**	**643 530,68 €**	**872 765,23 €**	**107%**	**99%**	**101%**
CG.1	122 108,00 €	549 459,00 €	671 567,00 €	121 117,70 €	546 019,52 €	667 137,22 €	99%	99%	99%
CG.2	- €	- €	- €			- €			
CG.3	92 000,00 €	100 000,00 €	192 000,00 €	108 116,85 €	97 511,16 €	205 628,01 €	118%	61%	32%
DI			**- €**						
EA			**- €**						
FG		**219 233,64 €**	**219 233,64 €**		**219 233,64 €**	**219 233,64 €**		**100%**	**100%**
Total général	**1 217 826,56 €**	**4 855 802,19 €**	**6 073 628,75 €**	**469 383,45 €**	**2 714 096,08 €**	**3 183 479,52 €**	**39%**	**56%**	**52%**

4.2 Exécution financière globale

4.2.1 Etats des décaissements faits par l'AFD

Les décaissements globaux du PAE depuis 2018 sont de **14 669 383,70 €**, soit 93**%** du montant global du Programme.

Tableau 6 : Taux de décaissement global par l'AFD du budget du PAE

Étiquettes de lignes	Composantes	Décaissements totaux	Taux de décaissement	Reste à décaisser par l'AFD
ACV	4 588 645,17 €	1 427 611,58 €	31%	3 161 033,59 €
ATA	1 415 300,00 €	4 533 081,20 €	320%	- 3 117 781,20 €
FRC	1 770 400,00 €	1 964 431,10 €	111%	- 194 031,10 €
ECP	3 628 809,47 €	3 213 423,67 €	89%	415 385,81 €
CG	3 713 998,88 €	2 980 424,75 €	80%	733 574,13 €
EA	73 362,00 €	26 902,40 €	37%	46 459,60 €
DI	52 475,48 €	16 500,00 €	31%	35 975,48 €
FG	507 009,00 €	507 009,00 €	100%	- €
	15 750 000,00 €	**14 669 383,70 €**	**93%**	**1 080 616,30 €**

Le reste à décaisser est de 2 080 616,30 euros et servira à payer les dernières factures des prestataires jusqu'en Août 2025.

Figure 9 : Evolution des décaissements par l'AFD des fonds du PAE de 2018 à 2024

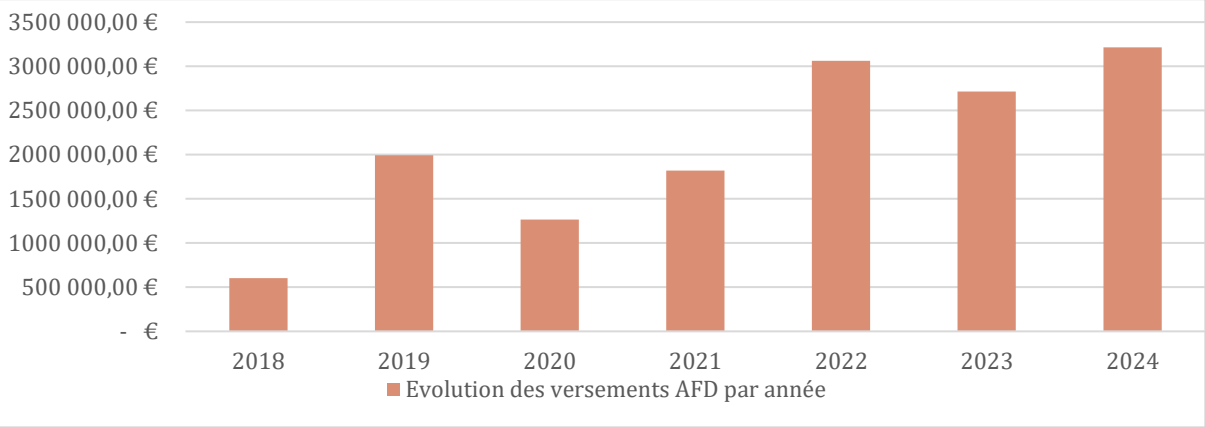

L'évolution du taux de décaissement des fonds auprès de l'AFD suit le rythme de mise en œuvre du programme. Ainsi, l'année 2024 a un taux de décaissement au 31 octobre 2024 relativement similaire à celui de l'année 2022 et cela s'explique par l'accélération de l'exécution des activités et le décaissement de l'avance finale du PAIAD d'un million d'euros en fin d'année 2024.

4.2.2 Engagements contractuels globaux

Au 31 octobre 2023, les engagements contractuels globaux s'élèvent à **11 747 072,67 €**, soit **75%** du budget global du PAE :

- 5 166 240,27 € sont relatifs à des contrats de prestation de services,
- 4 414 325,40 € sont relatifs aux accords de subvention signés avec les porteurs de projets de terrain,
- 1 516 507,00 € sont relatifs aux accords de subvention signés avec les Centres de formation, et
- 650 000,00 € sont relatifs aux accords de subvention signés avec les Partenariats OPA – CR – CF.

4.2.3 Dépenses justifiées globales

Les dépenses justifiées du PAE depuis 2018 sont de **13 558 955,73 €**, soit **86%** du montant global du Programme.

Tableau 7 : Taux de dépenses justifiées globales du PAE par composante

Composantes	Budget du PAE	Dépenses justifiées totales	Taux de dépenses	Reste à dépenser
ATA	4 588 645,17 €	4 411 151,20 €	96%	177 493,97 €
ACV	1 415 300,00 €	788 304,57 €	56%	626 995,43 €
FRC	1 770 400,00 €	1 386 278,94 €	78%	384 121,06 €
ECP	3 628 809,47 €	2 731 601,50 €	75%	897 207,97 €
CG	3 713 998,88 €	3 606 912,99 €	97%	107 085,89 €
EA	73 362,00 €	71 951,90 €	98%	1 410,10 €
DI	52 475,48 €	55 745,64 €	106%	- 3 270,16 €
FG	507 009,00 €	507 009,00 €	100%	- €
Total général	**15 750 000,00 €**	**13 558 955,73 €**	**86%**	**2 191 044,27 €**

Figure 10 : Evolution du montant de dépenses justifiées du PAE de 2018 à 2024

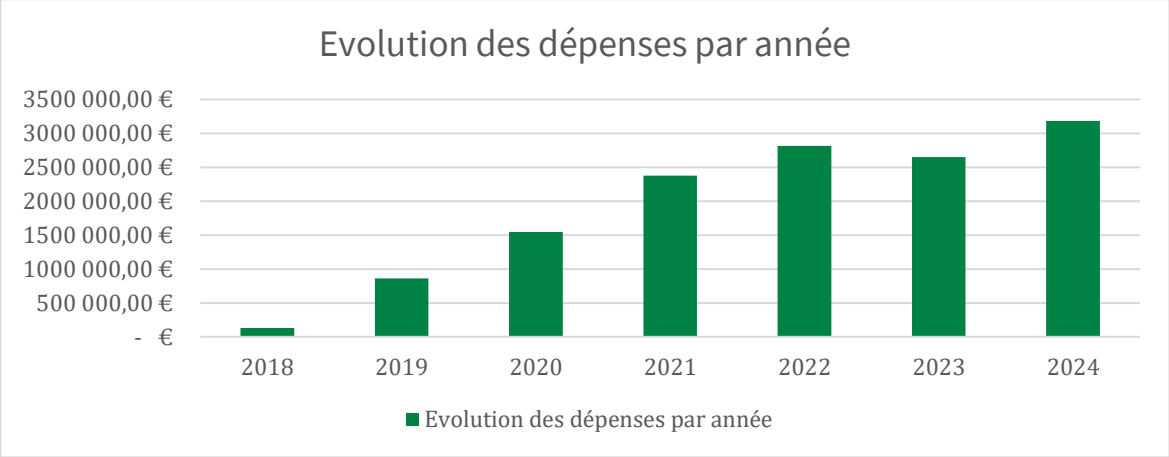

L'évolution du taux des dépenses suit le rythme de mise en œuvre du programme. Ainsi, l'année 2024 a un taux de dépenses au 31 octobre 2024 relativement similaire à celui de l'année 2022 et cela s'explique par la mise en œuvre des activités des centres de formation et des partenariats OPA – CF – CR. Le taux d'exécution 2024 connaitra une évolution une fois les dernières activités menées d'ici le 14 Août 2025.

4.3 Exécution financière du PATAE

4.3.1 Etats des décaissements faits par l'AFD

Les décaissements globaux du PATAE depuis 2018 sont de **7 725 550,57 €**, soit **97%** du montant global du Projet.

Tableau 8 : Taux de décaissement global par l'AFD du budget du PATAE

Composantes	Budget du PATAE	Décaissements totaux	Taux de décaissement	Reste à décaisser par l'AFD
ATA	4 588 645,17 €	4 533 081,20 €	99%	55 563,97 €
ECP	1 745 609,47 €	1 666 211,65 €	95%	79 397,82 €
CG	1 539 907,88 €	1 482 855,32 €	96%	57 052,56 €
EA	73 362,00 €	26 902,40 €	37%	46 459,60 €
DI	52 475,48 €	16 500,00 €	31%	35 975,48 €
Total général	**8 000 000,00 €**	**7 725 550,57 €**	**97%**	**274 449,43 €**

4.3.2 Engagements contractuels sur le PATAE

Au 31 octobre 2024, les engagements contractuels sur le PATAE s'élèvent à **6 614656,49 €**, soit **80%** du budget global du PATAE :

- 2 000 331,09 € sont relatifs à des contrats de prestation de services, et
- 4 414 325,40 € sont relatifs aux accords de subvention signés avec les porteurs de projets de terrain.

4.3.3 Dépenses justifiées globales

Les dépenses justifiées du PATAE depuis 2018 sont de **7 256 068, 45 €**, soit**91%** du montant global du Projet.

Tableau 9 : Taux de dépenses justifiées du PATAE par composante

Composantes	Budget du PATAE	Dépenses totales justifiées	Taux de dépenses	Reste à dépenser
ATA	4 588 645,17 €	4 411 151,20 €	96%	177 493,97 €
ECP	1 745 609,47 €	1 197 971,51 €	69%	547 637,96 €
CG	1 539 907,88 €	1 519 248,19 €	99%	20 659,68 €
EA	73 362,00 €	71 951,90 €	98%	1 410,10 €
DI	52 475,48 €	55 745,64 €	106%	- 3 270,16 €
Total général	**8 000 000,00 €**	**7 256 068,45 €**	**91%**	**743 931,55 €**

4.4 Exécution financière du PAIAD

4.4.1 Etats des décaissements faits par l'AFD

Les décaissements globaux du PAIAD depuis 2020 sont de 6 943 833,13 **€**, soit **90%** du montant global du Projet.

Tableau 10 : Taux de décaissement global par l'AFD du budget du PAIAD

Composantes	Budget du PAIAD	Décaissements totaux	Taux de décaissement	Reste à décaisser par l'AFD
ACV	1 415 300,00 €	1 427 611,58 €	101%	- 12 311,58 €
FRC	1 770 400,00 €	1 964 431,10 €	111%	- 194 031,10 €
ECP	1 883 200,00 €	1 547 212,02 €	82%	335 987,98 €
CG	2 174 091,00 €	1 497 569,43 €	69%	676 521,57 €
FG	507 009,00 €	507 009,00 €	100%	- €
Total général	**7 750 000,00 €**	**6 943 833,13 €**	**90%**	**806 166,87 €**

4.4.2 Engagements contractuels sur le PAIAD

Au 31 octobre 2024, les engagements contractuels sur le PAIAD s'élèvent à **5 332416,19 €**, soit **69%** du budget global du PAIAD :

- 3 165909,19 € € sont relatifs à des contrats de prestation de services,
- 1 516 507,00 € sont relatifs aux accords de subvention signés avec les Centres de formation, et
- 650 000,00 € sont relatifs aux accords de subvention signés avec les Partenariats OPA – CR – CF.

4.4.3 Dépenses justifiées globales

Les dépenses justifiées du PAIAD depuis 2020 sont de **6 302 887,28 €,** soit **81%** du montant global du Projet

Tableau 11 : Taux de dépenses justifiées du PAIAD par composante

Composantes	Budget du PAIAD	Dépenses totales justifiées	Taux de dépenses	Reste à dépenser
ACV	1 415 300,00 €	788 304,57 €	56%	626 995,43 €
FRC	1 770 400,00 €	1 386 278,94 €	78%	384 121,06 €
ECP	1 883 200,00 €	1 533 629,99 €	81%	349 570,01 €
CG	2 174 091,00 €	2 087 664,79 €	96%	86 426,21 €
FG	507 009,00 €	507 009,00 €	100%	- €
Total général	**7 750 000,00 €**	**6 302 887,28 €**	**81%**	**1 447 112,72 €**

4.4.4 Suivi de l'utilisation des tranches de préfinancement versées par l'UE à l'AFD

Tranches de préfinancement	Montant	Montants engagements contractuels	Montants dépensés et justifiés	Taux d'engagement / décaissement	Taux de dépenses
Première tranche	1 398 852,00 €	1 398 852,00 €	1 398 852,00 €	100%	100%
Deuxième tranche	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	100%	100%
Troisième tranche	3 351 148,00 €	933 564,19 €	1 904 035,28 €	28%	57%
Total Général	**7 750 000,00 €**	**5 332 416,19 €**	**6 302 887,28 €**	**69%**	**81%**

En conclusion, la première et la deuxième tranche de préfinancement ont été engagées est dépensée à 100%. La troisième tranche est engagée à 28% et dépensée à 57%.

L'AFD a donc, demandé et reçu de l'UE, la totalité du préfinancement de 7 750 000 d'euros au 31/12/2024.

5 | Principales difficultés, défis et propositions de solutions

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme se présentent dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12 : Difficultés rencontrées et solutions apportées

Principales difficultés rencontrées	Mesures correctives
La rupture des fonds de l'UE sur le compte de l'AFD (suite à une demande de tranche tardive de l'AFD auprès de l'UE), couplées à des problèmes techniques du logiciel de versement de l'AFD, entrainant de sérieux retards dans la mise en place des tranches de financement à verser aux centres de formation, partenariats, CN et 3AO et le démarrage des activités du MOOC. Les partenaires sont démotivés et ils ne seront pas en mesure d'exécuter la totalité de leur plan d'actions	Alertes à l'AFD sur les conséquences dans la mise en œuvre des activités et la clôture des projets Déblocage partiel de la situation à fin juillet et mise à disposition progressives des fonds aux partenaires Demande de replanification réaliste des activités par tous les partenaires pour tenir compte de la date d'achèvement technique fixée au 31/12/2024, certains sont autorisés à poursuivre les activités opérationnelles jusqu'au 14/03/2024
Le retard dans le déclenchement des audits des CN, de 3AO et des porteurs de projets	Mise en place d'un dispositif de suivi mensuel des dépenses des partenaires et alertes pour déclencher les audits le cas échéant
Le retard dans la transmission des rapports trimestriels et semestriels par les partenaires du projet (CN, 3AO, centres de formation et partenariats OPA) et la non mise à jour mensuelle de leurs BDD	Rappel mail, téléphonique et WhatsApp Rappel des obligations contractuelles aux CN et 3AO aux réunions régionales Courrier du DE ARAA de rappel sur le reporting
L'annonce du retrait du Mali, Burkina Faso et Niger de la CEDEAO, ayant eu des impacts forts sur la mise en œuvre des projets de terrain et des CN : les lettres avenantes des CN des pays de l'AES et celles du CF et de l'OPA au Mali ne sont pas signés (aucun versement effectué pour le CF et OPA du Mali)	Relance sans succès Arrêt des actions et missions de pré-audit a été menée par l'UCP auprès des Correspondants nationaux des ministères de l'agriculture concernés pour préparer la clôture des comptes Non mention de la CEDEAO et de l'appui des bailleurs lors des actions de visibilité sur le terrain au Niger et Burkina Faso
La situation géopolitique et sécuritaire dans certains pays qui entravent la mise en œuvre des activités des CN et sur le terrain dans certains pays	Délocalisation de certaines activités dans les zones plus sécurisées autant cela a été possible et en changeant d'approche Annulation des missions de suivi-évaluation dans les zones d'insécurité et rencontres des partenaires dans villes sécurisées
L'absence de coordinateur au niveau de la plateforme 3AO, bloquant les activités à leur niveau	Le Secrétaire exécutif du ROPPA a dû se substituer au coordinateur démissionnaire. Le recrutement du nouveau coordinateur est en cours.

PTBA 2025

1 | Orientations majeures du PTBA 2025

En 2024, le Programme Agroécologie en Afrique de l'Ouest est rentré dans son rythme de croisière mais les difficultés de mise en place des fonds à certains partenaires par l'AFD a sérieusement ralenti le déroulement des actions. Malgré les ambitions affichées, le PTBA 2024 a été exécuté en deçà des attentes. L'année 2025 sera consacrée à la clôture des activités opérationnelles jusqu'au 14 mars 2025, la conduite des audits finaux, l'évaluation finale conduite par l'UE, la finalisation de la capitalisation transversale et l'organisation de l'atelier final du PAE.

2 | Plan de travail 2025

2.1 Rappel des résultats attendus

Dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2025, les principaux résultats attendus sont :

- L'ensemble des projets des centres de formation et des partenariats OPA-centres de recherche et centres de formation et ou structures de vulgarisation, les comptes des CN et de 3AO sont clôturés sur le plan comptable et les éventuels reliquats de fonds sont reversés à l'ARAA.
- Le guide de capitalisation est traduit dans les 3 langues et diffusé.
- La capitalisation transversale du Programme est bouclée.
- Un bilan global du Programme est réalisé et les résultats de la capitalisation sont partagés avec un grand public.
- Le contenu du MOOC Agroécologie est adapté au contexte ouest africain.
- Le rapport d'exécution final du Programme est élaboré et approuvé.
- Les excédents et les ressources non utilisées sont comptabilisés
- Le document de clôture technique et financière ainsi que les autres données relatives aux résultats du Programme sont introduits dans le système d'archivage informatisé de l'ARAA.
- Une note de clôture adossée au document de clôture est élaborée et approuvée par le DE de l'ARAA qui se charge de leur transmission aux bailleurs (AFD et UE).
- Les formulaires des notes de clôture technique et comptable sont remplis.
- Les documents de capitalisation sont publiés sur le site web de l'ARAA, de la DADR, de l'AFD et de l'UE et sur divers autres sites (UEMOA, CILSS, 3AO, etc.).

Les activités planifiées dans le présent programme de travail et budget annuel (PTBA) de 2025 portent sur les trois dernières composantes du PAE.

2.2 Composante ATA - Appui à la Transition agroécologique pour les acteurs locaux

En 2025, la principale activité programmée sur la composante est la traduction dans les 3 langues de la CEDEAO et la diffusion du guide de capitalisation des bonnes pratiques des projets de terrain.

Les décaissements prévus liés à cette action sont de **145 400,09 €** sur les fonds du PATAE.

2.3 Composante FRC - Formation et renforcement des capacités pour l'intensification agroécologique et l'agriculture durable

En 2025, les activités à mettre en œuvre sur cette composante se concentreront principalement sur : (i) l'achèvement technique de quelques activités résiduelles et la clôture des projets des centres de formation en agroécologie, (ii) l'arrêt et la clôture des activités en démarrage du MOOC en raison de la clôture du PAE, et (iii) la contribution à la plateforme e-learning de l'ECOWAP

Les dépenses prévues en sur cette activité sont estimées à **496 126,55 €** sur les fonds du PAIAD.

2.4 Composante ACV - Appui-conseil et vulgarisation des innovations technologiques

Pour l'année 2025, les activités prévues vont porter également sur : (i) l'achèvement technique des activités résiduelles et la clôture projets de partenariats entre OPA, centres de recherche et centre de formation, (ii) la clôture du contrat de prestation du CIRAD relatif à l'étude sur la consolidation du conseil en agroécologie en Afrique de l'Ouest, et (iii) la contribution à l'élaboration du Mémento de l'agroécologie

Les dépenses prévues en 2025 sur cette composante sont estimées à **296 950,00 €** sur les fonds du PAIAD.

2.5 Composante ECP - Echanges, capitalisation et contribution à l'élaboration de politiques publiques d'intensification agroécologique

En 2025, les activités planifiées sur cette composante vont concerner : la clôture des activités de 3AO, ainsi que sur l'achèvement de quelques activités résiduelles et la clôture des comptes des Correspondants nationaux.

La capitalisation transversale du Programme sera bouclée.

La communication de l'atelier final du PAE sera assurée, ainsi que l'impression des documents pour les participants.

Les dépenses prévues en 2025 sur cette composante sont estimées à **669 649,56 €**, dont **278 746,52 €** sur les fonds du PATAE et **390 903,04 €** sur les fonds du PAIAD.

2.6 Composante CG - Coordination et gestion du programme

Les activités prévues pour la mise en œuvre de cette composante en 2024 vont porter sur : (i) l'appui à la maitrise d'ouvrage dans la coordination et la gestion courante du PAE ; (ii) les audits et la clôture des projets et accords de subventions avec les partenaires ; et (iii) l'organisation d'un atelier bilan du PAE et les activités de clôture technique et financière du Programme.

2.6.1 CG.1 - Appui à la maitrise d'ouvrage dans la coordination et la gestion courante du PAE

Au-delà des activités du PAE, l'équipe de l'UCP participera toujours aux réunions régionales relatives à la transition agroécologique et à la formulation de nouveaux projets et programmes régionaux en lien avec la transition agroécologique. L'UCP contribuera aussi à l'organisation des comités de pilotage régionaux 2025 de l'ARAA.

Par ailleurs, le personnel de l'UCP peut être mobilisé selon leur domaine de compétence pour représenter l'ARAA dans les rencontres en lien avec l'agroécologie.

En 2025, les principales activités planifiées seront :

- La clôture administrative des projets des centres de formation et des partenariats, des accords de subvention avec 3AO et les Correspondants nationaux ; et
- L'organisation de l'atelier bilan du PAE, regroupant environ 130 participants pendant 3 jours, où seront présenté les principaux résultats du programme et les produits de la capitalisation transversale.

2.6.2 CG.2 - Suivi-Evaluation

Il est prévu que l'UE conduise, sur ses fonds en gestion directe, l'évaluation finale du Programme.

2.6.3 CG.3 - Audits et appuis à l'ARAA

CG.3.1 – Audits

Les audits vont concerner aussi bien les comptes de l'ARAA que ceux des autres intervenants du PAE.

Comptes ARAA : conformément aux Conventions de financement, chaque année les comptes de l'ARAA (PATAE et PAIAD) seront audités pour assurer la clôture globale du Programme.

Comptes des autres intervenants du PAE (hors projets de terrains traités en ATA.3) : dans le cadre de la mise en œuvre du programme, la CEDEAO a signé des MoUs avec les Ministères de l'Agriculture, le 3AO, et des accords de subvention avec les centres de formation et les partenariats OPA-CR-CF. Les comptes de ces partenaires seront également audités (audits finaux).

CG.3.2 – Appuis divers à l'ARAA

Le programme est totalement intégré au dispositif de l'ARAA. A cet effet, l'équipe appuiera l'ARAA dans la réalisation de certaines tâches pour le fonctionnement efficace de l'institution. Les appuis peuvent porter sur la passation de marchés en participant aux recrutements des prestataires de l'ARAA, au suivi technique, financier, à l'organisation du CoPil dont l'UCP devra assurer le secrétariat, à la contribution à l'organisation de réunions régionales (ex : SARA) et au soutien à l'équipement de l'agence etc. Par ailleurs, le PAE continuera à prendre en charge le personnel de l'ARAA sur d'éventuelles missions.

Les dépenses prévues en 2025 sur cette composante sont estimées à **876 279,03 € €,** dont **207 706,11 €** sur les fonds du PATAE 668 572,92 € sur les fonds du PAIAD.

3 | Budget 2025 du PAE

Les prévisions budgétaires sont estimées à 2 484 405,24 €, dont 631 852,72 € imputables au financement de l'AFD et 1 852 552,52 € imputables au financement de l'UE. En 2025, la programmation budgétaire se présente dans le tableau ci-dessous.

Tableau 13 : Prévisions budgétaires de 2025

Composantes / Activités	Description sommaire des activités/tâches	Prévisions 2025 PATAE AFD	Prévisions 2025 PAIAD UE	Total PTBA 2025 PAE	T1 2025	T2 2025	T3 2025
ATA		**145 400,09 €**	**- €**	**145 400,09 €**			
ATA.1	-	- €	- €	- €			
ATA.2	Prise en charge de la participation des représentants des porteurs de projets à l'atelier de clôture	78 798,79 €	- €	78 798,79 €			
ATA.3	Finalisation du document de capitalisation des bonnes pratiques, traduction et impression / contrat Issala	66 601,30 €	- €	66 601,30 €			
FRC		**- €**	**496 126,55 €**	**496 126,55 €**			
FRC.1							
FRC.2	Poursuite des activités des centres de formation jusqu'en mars 2025	- €	75 000,00 €	75 000,00 €			
	Participation des représentants des centres de formation à l'atelier de clôture	- €	100 000,00 €	100 000,00 €			
FRC.3.1	Adaptation du Mooc / Contrat institut Agro	- €	156 126,55 €	156 126,55 €			
	Participation des représentants du Consortium d'Université et de l'Institut Agro à l'atelier de clôture	- €	15 000,00 €	15 000,00 €			
FRC.3.2	**Contribution à Ecowas e-learning**	- €	**150 000,00 €**	**150 000,00 €**			
ACV		**- €**	**296 950,00 €**	**296 950,00 €**			
ACV.1	Poursuite des activités des partenariats jusqu'en mars 2025	- €	35 000,00 €	35 000,00 €			
	Participation des représentants des partenariats à l'atelier de clôture	- €	100 000,00 €	100 000,00 €			
ACV.2.1	Consolidation des connaissances , mise en place et dynamisation des plateformes / Contrat CIRAD	- €	99 950,00 €	99 950,00 €			
ACV.2.2	**Contribution à l'élaboration du Mémento de l'agroécologie**		**62 000,00 €**	**62 000,00 €**			
ECP		**278 746,52 €**	**390 903,04 €**	**669 649,56 €**			
ECP.1	Prise en charge des représentants de 3AO pour l'atelier de clôture du PAE	- €	10 000,00 €	10 000,00 €			
ECP.2	Dernières activités de communication / contrat Issala	5 600,00 €	- €	5 600,00 €			
	Finalisation de l'étude capitalisation / contrat LARES-GRET-Inter-Réseaux	- €	134 610,00 €	134 610,00 €			
	Budget de communication et impression des documents de capitalisation pour l'atelier de clôture du PAE	100 000,00 €	- €	100 000,00 €			
ECP.3	Activités de clôture des CN et participation à l'atelier de clôture du PAE	73 146,52 €	146 293,04 €	219 439,56 €			
	Atelier de clôture du PAE : coûts logistiques (location de salle, repas, traduction, etc.), hors perdiem, billets d'avion et communication	60 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €			
	Prise en charge d'invités extérieurs + personnel ARAA/DADR + UCP pour l'atelier de clôture du PAE	40 000,00 €	60 000,00 €	100 000,00 €			
ECP.4		- €	- €	- €			
CG		**207 706,11 €**	**668 572,92 €**	**876 279,03 €**			
CG.1	Appui à la maitrise d'ouvrage dans la coordination et la gestion courante du PAE / contrat AVSF-IRAM-INADES	103 105,03 €	431 370,75 €	534 475,79 €			
CG.2	-			- €			
CG.3	Appui divers à l'ARAA dont équipements et financement du Comité de Pilotage 2025	50 000,00 €	**176 000,00 €**	**226 000,00 €**			
	Audit des comptes 2024 et finaux du PATAE et du PAIAD (comptes ARAA) / contrat PWC	34 000,00 €	20 000,00 €	54 000,00 €			
	Audits finaux des CN / 3AO / Centres de Formation / Partenariats / Contrat Pyramis	20 601,08 €	41 202,17 €	61 803,25 €			
EA		**- €**	**- €**	**- €**			
EA.1	-	- €	- €	- €			
DI		**- €**	**- €**	**- €**			
FG		**- €**	**- €**	**- €**			
Total général		**631 852,72 €**	**1 852 552,52 €**	**2 484 405,24 €**			

4 | Conclusion, perspectives et recommandations

La mise en œuvre des activités planifiées dans le PTBA 2024 du PAE a enregistré des résultats modestes compte tenu des problèmes informatiques de versement des fonds rencontrés par l'AFD. Ces problèmes n'ont pas permis la mise en place à temps des fonds à plusieurs partenaires qui n'ont pas pu démarrer leurs activités conformément à leurs plans de travail. Certains Correspondants nationaux n'ont même pas pu réaliser leurs PTBA 2024. De même, malgré les multiples alertes aux centres de formation, et partenariats OPA-CR-CF, certains n'ont pas pu déclencher à temps les audits de premières tranches reçues et ont attendu d'avoir consommé 90 à 100% de leurs premières tranches, ce qui a eu comme conséquences le blocage des activités lorsque le partenaire n'a pas pu préfinancer les activités avant la réalisation des audits.

Globalement, des résultats importants ont pu être enregistrés et ont contribué à augmenter la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages bénéficiaires, au renforcement conséquent des centres de formation et des partenariats OPA-CR-CF en infrastructures et équipements pédagogiques et de démonstrations/expérimentations. Les objectifs de formation d'au moins 200 apprenants par centre de formation compte tenu du démarrage tardif des activités de ces partenaires ont été atteints voire dépassés par certains centres. Près de 3 000 personnes (dont 48% de jeunes) ont été formées dans les centres de formation et plus de 6 600 apprenants ont été formés dans le cadre des partenariats et une centaine de pratiques agroécologiques conduites ou coconstruits avec les producteurs ont été adaptées et adoptées. Quelques-unes de ces innovations énigmatiques concernent la sédentarisation de la culture d'igname dans un système de rotation à base de Mucuna et de Cajanus avec des rendements de près de 60 tonnes à l'hectare, l'intégration poisson-riz et maraîchage, la formation à domicile des femmes vulnérables via WhatsApp sur des pratiques agroécologiques et l'agribusiness, l'utilisation des plantes fertilisantes comme tuteurs aux plants d'igname pour réduire l'empreinte biophysique de cette culture, le maintien en vie des poissons dans un étang pendant en situation de rupture d'aliments pendant deux semaines, etc. De même, 331 agents des structures de vulgarisation nationales ont été formés sur les pratiques agroécologiques et une cinquantaine de cadres nationaux et régionaux ont bénéficié d'une formation sur l'accès aux fonds climat et à l'élaboration de projets agricoles résilients/sensibles au climat.

Dans le cadre des synergies d'actions avec les projets PAE, AIC, Readiness-FVC et les réseaux 3AO, WAfrOnet ainsi que l'ONG internationale Action Aid, un premier Forum international sur l'agroécologie et l'agriculture biologique a été organisé à Abuja au Nigéria et rassemblé près de 400 participants autour du financement de la transformation des systèmes alimentaires et nutritionnels basés sur des approches agroécologiques et agri biologiques.

Le premier semestre de l'année 2025, qui est celui de la clôture du programme, sera marqué notamment par la mise en œuvre des activités résiduelles des projets des centres de formation et des partenariats et du MOOC Agroécologie jusqu'au 14/03/2024 et par la clôture de l'ensembles des projets et accords de subventions avec les partenaires. Un atelier bilan global du Programme est prévu au cours duquel tous produits de capitalisation seront présentés.

En termes de perspectives, un point d'information sera présentant aux participants de l'atelier bilan sur le nouveau projet DéSIRA plus.

ANNEXES

ANNEXE 1 : RESUME DES ACTIVITES CONDUITES PAR LES CENTRES DE FORMATION 46
ANNEXE 2 : RESUME DES ACTIVITES CONDUITES PAR LES PARTENARIATS OPA-CR-CF 55
ANNEXE 3 : RESUME DES ACTIVITES CONDUITES PAR LES CORRESPONDANTS NATIONAUX 62
ANNEXE 4 : PTBA 2025 CONSOLIDE DU PAE 67

Annexe 1 : Résumé des activités conduites par les centres de formation

N°	Pays	Centres de formation
1	Bénin	Recrutement d'un comptable professionnel permanent pour 15 mois Formation de 160 apprenants sur les techniques agroécologiques Renforcement des capacités de 12 personnes du centre en gestion administrative, en agroécologie, en ingénierie de formation et pédagogique dont 3 femmes et 4 jeunes Organisation des visites d'échange au profit de 34 apprenants dont 19 femmes et 29 Jeunes Acquisitions de divers supports pédagogiques et équipements agricoles pour les travaux pratiques en traction animale Construction d'une salle de formation et son équipement Amélioration des modules de formation en agroécologie (modules revus) Rédaction des référentiels de formation communs avec d'autres centres 294 personnes formées sur 400 prévus en fin de projet en 2024 Identification de 6 personnes pour le renforcement de leurs capacités aux TIC et fonctionnement (frais de tenue de compte en Banque, les agios liés aux opérations bancaires, acquisition de meubles et mobiliers de bureau, frais d'envoi des courriers vers les partenaires, mission de suivi-évaluation et autres) Participation de 02 personnes à un programme de formation sur les changements climatiques Organisation d'un voyage d'échange au Togo à Niamtougou dans le centre ECOVILALGE/CIDAP pour 8 personnes dont 5 jeunes
2	Burkina Faso	Formations de 15 formateurs et des gestionnaires du centre sur l'approche holistique de l'AE, sur l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de formation, sur le bocage Formation de 8 gestionnaires du centre sur le management et les gestions économique et financière Elaboration d'un plan d'affaire et le plan d'actions 2023-2025 du CPR avec la participation de 8 formateurs Formation sur le montage de projets éligibles aux fonds climats au profit de 08 gestionnaires du centre Un voyage d'étude a été effectué au CIDAP au Togo au profit de 05 formateurs et gestionnaires du centre Elaboration et validation d'un manuel de producteur agroécologique au cours d'un atelier

		Atelier de validation de 3 modules de formation en agroécologie selon l'APC (Réalisation des ouvrages antiérosifs et de conservation des eaux et des sols, Production de biofertilisants et Production de biopesticides) Organisation d'un voyage d'étude / visite d'échanges au centre écologique Albert Schweitzer de Ouagadougou au profit de 13 apprenants et 4 formateurs et gestionnaires du CPR de Kodougou Atelier de définition d'un dispositif de suivi appui conseil des formés avec 6 formateurs et gestionnaires du centre et 2 membres du réseau des jeunes formés au centre Quatre sorties pédagogiques faites dans des exploitations modèles au profit de 22 jeunes en formation et 8 formateurs et gestionnaires du centre Organisation de voyage d'étude aux centres BEO NEERE et Bangre Nooma à Ouagadougou pour 12 gestionnaires et formateurs du centre Installation d'un site intégré de démonstration des pratiques agroécologiques de 2 ha Formation continue de 120 jeunes déjà formés au CPR de Kodougou sur les pratiques agroécologiques du manuel du producteur Réhabilitation de l'unité apicole avec 4 de ruches et du matériel d'exploitation Achat de semences forestières pour 3 espèces (Moringa, Baobab, Albida) Le suivi-appui conseil et traçabilité dans la région de la Boucle du Mouhoun de 81 agriculteurs dont 32 femmes formés en agroécologie Mise en place d'une pépinière forestière par la clôture du site, le labour, la construction de bassin de stockage d'eau, la construction de hangar et la formation de pépiniéristes Acquisition de plusieurs intrants organiques pour la production agroécologique Acquisition de plusieurs petits matériels agricoles pour les activités pédagogiques
3	Cap Vert	Fonds reçus tardivement, démarrage supposé des activités en janvier 2024. Mais rien Pas d'informations fournies
4	Côte d'Ivoire	Les compétences des formateurs et des gestionnaires (06) sont renforcées en ingénieries pédagogique et de formation et en montage de projets éligibles aux fonds climat Les capacités des gestionnaires et des formateurs (16) du CFGL sont consolidées en agroécologie et recherche de partenariats productifs Des curricula de formation en agroécologie sont développés et implémentés Elaboration des manuels de formation Réhabilitation des unités pédagogiques et de production (l'unité apicole, du poulailler, de la bergerie, etc.) et suivi des sujets

		Acquisition des équipements de production Acquisitions d'équipements pédagogiques et de matériels agricoles Aménagement d'un magasin d'extraction et de stockage de miel Acquisition d'un fût de 5000L Réhabilitation d'un bloc dortoir de 10 chambres Réhabilitation de 2 salles de formation Réalisation d'un forage fonctionnel Installation de 3 sites de démonstration Formation de 86 producteurs dont 20 femmes en agroécologie 01 programme de formation sur l'agroécologie inséré dans le PO du CFGL Acquisition d'1 tricycle pour le transport des productions et d'1 groupe électrogène Suivi-évaluation des apprenants formés dans 4 groupements avec 22 formés et 128 personnes touchées
5	Gambie	Achats d'équipement et de matériels de formation (photocopieuse, appareil photo, ordinateur de table, etc.) Elaboration d'un manuel de formation en agroécologie pour le centre Renforcement des capacités du personnel du centre et autres structures du ministère de l'agriculture (19 personnes dont 11 femmes) Formation de 38 producteurs leaders et maraichers dont 10 femmes Acquisition et distribution d'intrants et de petits matériels de maraichage au profit du centre et de 5 communautés villageoises
6	Ghana	Construction du modèle de la chaîne de valeur intégrée de la volaille et du poisson Développement de 10 modèles de curricula Opérationnalisation initiale du modèle de la chaîne de valeur intégrée de la volaille et du poisson Exécution de deux cycles de production de poissons chats et de poulets de chair avec le modèle Formation de 20 facilitateurs sur le modèle Formation de 65 jeunes sur le modèle, dont 12 femmes

		Formation de 126 personnes à l'utilisation du modèle intégré, dont 37 femmes Elaboration du plan stratégique du centre
7	Guinée	Elaboration et multiplication des fiches de suivi et évaluation Achat de matériels et équipements pédagogiques Démarrage des activités de réhabilitation des bâtiments Formation à l'intention de 6 cadres du centre en gestion économique, financière et managériale Préparation du module de formation en technique du système agroécologie à l'attention des cadres du centre Formation de 6 cadres du centre sur l'appui à l'archivage des documents la clarification du fonctionnement des postes, la planification des activités, le partage des rôles et responsabilités Réhabilitation de l'aire de séchage Achat d'un motoculteur 5 agents additionnels recrutés Formation de 13 agents du centre en techniques de système agroécologique Formation de 250 apprenants jeunes et professionnels en agroécologie Installations des parcelles de démonstration : association maïs-niébé, rotation des cultures, paillage Fabrication de composte aérien Achat petits outillage agricole Réalisation d'un diagnostic organisationnel du centre Projet d'établissement élaboré Formation de cinq 5 cadres en ingénierie pédagogique Formation de 10 cadres en ingénierie de formation Voyage d'étude dans la ferme agroécologique de KAYDARA Sénégal
8	Guinée-Bissau	Infos non disponibles. Pas encore de financement Pas d'informations fournies

9	Liberia	Elaboration du curricula et des modules de formation Développement d'un outil social en langue locale pour la sensibilisation Sensibilisation des populations des villages et villes sur l'agroécologie à travers divers canaux de médias Ex : développement de jingles en langue locale sur l'agroécologie et le changement climatique Acquisitions de divers matériels pour le bureau et les activités pédagogiques Réhabilitation de poulailler et de la porcherie Mise en place d'un site de compostage Formation de 15 formateurs sur l'agroécologie/CC (dont 5 femmes) Renforcement de capacités de 7 managers du centre Organisation d'une visite d'échange Centre Songhaï au Bénin (1 manager du centre et 2 formateurs) Mise à jour du plan stratégique du centre à 5 ans Réhabilitation des salles de classe et du dortoir Installations de 10 ha sites de démonstration in situ des pratiques agroécologiques Acquisition d'un power tiller, équipement agricole, matériel de plantation et intrants Acquisition d'un générateur et d'une connexion internet Formation de 300 personnes (dont 141 femmes), dont 200 jeunes et 100 agriculteurs installés
10	Mali	Infos non disponibles. Pas encore de financement Non applicable
11	Niger	Acquisition de matériels et équipements pédagogiques Elaboration de curricula et de modules de formations agroécologiques (manuel du producteur) Réalisation de certaines infrastructures (fosses de compostage, forage, château d'eau, étangs, trois poulaillers) Formation de 10 formateurs dont 7 femmes sur diverses techniques agroécologiques (élevage, transformation, aviculture, pisciculture, la vie associative, l'entrepreneuriat et la production de cosmétiques) 15 femmes formées en cultures maraichères

		10 femmes formées en pisciculture 50 femmes formées en aviculture 30 femmes formées en élevage des caprins Diverses autres formations en transformation agroalimentaire et en production de plants ont été données aux participantes Renforcement des compétences des formateurs et du personnel administratif dans l'approche holistique de l'agroécologie et en management. Un plan de développement pour 2024-2025 a été élaboré Divers équipements tels qu'un groupe électrogène, un système d'irrigation SUNSU, du matériel informatique, et un kit internet STARLINK, plusieurs équipements pour la sécurité, la foresterie, le maraîchage, et la pisciculture ont été acquis et livrés. Réhabilitation de la pépinière forestière et des dortoirs Un tricycle a été acquis pour faciliter les opérations Pas d'informations fournies au 30 septembre
12	Nigeria	Renforcement des capacités de quatorze (14) professeurs dont 4 femmes de l'ARMTI en agroécologie au Centre Songhaï, Porto Novo, République du Bénin. Visite d'étude au Centre CIDAP, Niamtougou, Togo par 14 professeurs de l'ARMTI sur l'agroécologie (dont 3 femmes) Restitution des leçons apprises aux centres Songhaï et CIDAP Formation du corps enseignant de l'ARMTI à l'élaboration de programmes de formation (conception de programmes de formation, méthodes de présentation et évaluation) – 99 personnes Formation du personnel de la faculté de l'ARMTI sur la mise en place de projets éligibles au fonds climatique – 99 personnes Etablissement de diverses unités de production maraîchère en AE, de démonstration en AE pour le riz, le manioc et le maïs, de production de fruits et de poulailler Rénovation d'unité piscicole Elaboration de Manuel de formation en AE ou Manuel de l'agriculteur Confection et implantation des plaques et banderoles de visibilité du projet Gestion des unités établies dans la ferme de formation et de démonstration (maïs, riz et manioc, papaye, banane et plantain volaille, pisciculture, maraîchage et compost) Acquisition d'un système d'irrigation par aspersion

		Développement de 13 modules de formation pour l'animation d'ateliers en agroécologie Formation de 150 jeunes (85 hommes, 65 femmes) sur la pisciculture intégrée au maraîchage Formation sur l'agroécologie de 14 jeunes (9 femmes ; 5 hommes) de diverses institutions supérieures du Nigeria qui sont à ARMTI pour leur stage obligatoire Formation de 200 stagiaires du projet Skill-Up Artisans du Fonds de formation industrielle sur l'agroécologie (son application dans la production de cultures, de volailles et de bétail).
13	Sénégal	Lancement et attribution de 2 marchés pour le renforcement des capacités des ressources humaines de la ferme et pour la construction/réhabilitation des infrastructure de la ferme. Réalisation du diagnostic du centre et partage au personnel du document de diagnostic 10 formateurs et gestionnaires de la ferme sont formés en agroécologie Formation de 15 femmes en transformation des produits 10 formateurs et gestionnaires de la ferme sont formés en ingénierie de formation et en ingénierie pédagogique Construction d'un bâtiment d'hébergement de 12 places Formation de 93 apprenants et stagiaires en agroécologique (entre 20 et 40 ans), dont 40 femmes Réhabilitation des installations de la basse-cour Construction d'une étable pour les ruminants 14 curricula de formation construits dont 9 en formation continue et 5 en formation initiale Acquisition de PC, imprimante et fontaine d'eau Réalisation (en cours) d'un plan de développement stratégique de la F4C sur 3 ans Organisation de visites d'échanges et de partage d'expériences : Rencontres internationales des semences paysannes organisées par l'ONG SOL en France, Foire Régionale des Semences Paysannes de Djimini (Sénégal), Visite d'échange de fermes Agroécologiques au Bénin (Tcharm Fora – Centre agroécologique Songhai – Le jardin de l'espoir) Développement de partenariats avec les universités et les écoles de formation : Journée d'échange à l'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), visite d'échange au centre "Nous sommes la solution » de Niaguis Mise en place d'une unité de pisciculture (achevée à 80%)

14	Sierra Leone	Formation des formateurs en décembre 2023 (au nombre de 10) Réhabilitation des installations du centre de formation (étangs de pisciculture, poulaillers, étables pour petits ruminants et porcheries) Réhabilitation d'un hangar de conservation des semences des plantes Acquisition de semences d'arbres (mangue, agrumes, goyave, tamarin, anacardier, bois, avocat et légumes). Achat de bétail (chèvres, moutons, canards, poussins, lapins et alevins de poissons). Acquisition d'outils agricoles simples (houes, couteaux, pelles, bêches, bourgeons, sécateurs, cisailles, pulvérisateurs à dos, brouettes, etc.) Acquisition de machines pour le centre de formation (motoculteur, pompe à eau, écloserie, granulateur de poisson et broyeur de poisson) Organisation de 2 visites sur le terrain de l'ensemble du personnel et des apprenants dans différents sites agroécologiques Couverture médiatique des activités du centre Installation des plaques de signalisation sur les sites du projet Utilisation des réseaux sociaux Réhabilitation des infrastructures du centre (2 étangs) en cours Revue en cours des manuels de formation des apprenants Formation de 400 agriculteurs de différentes communautés Suivi et supervision des activités agricoles
15	Togo	Recrutement de 2 agents additionnels Visite d'échange au CIDAP de 15 animateurs La formation en conception et gestion de projet de 12 formateurs et membres du personnel administratif Acquisition de matériels et d'équipements pour les activités pédagogiques Formation d'un animateur en irrigation et pompe solaire pour 3 mois Formation de 38 volontaires d'engagement citoyen dont 20 femmes Construction de 3 dalles compostières (3,75T) Acquisition de fertilisants pour le maraîchage

		Acquisition de 20 ruches kenyanes Formation de 128 producteurs en agroécologie dont 64 femmes Initiation de 172 stagiaires dont 41 filles en agroécologie venant de 4 centres de formation Construction d'un parcours pour l'association agriculture, foresterie et élevage de pintades Aménagement d'un site maraîcher avec un système d'irrigation goutte à goutte Renforcement de compétences 2 formateurs en Andragogie au lycée d'enseignement technique de Sokodé 05 apprenants ont suivi la formation modulaire 2 animateurs formés en techniques de production de semences paysannes Visite d'échange au Centre de formation Rurale de Tami (CFRT) 62 formés et 7 accompagnateurs Suivi post formation de 96 formés

Annexe 2 : Résumé des activités conduites par les partenariats OPA-CR-CF

N°	Pays	Partenariats OPA
16	Bénin	Conduite des expérimentations sur la base des besoins des producteurs (identifiés suite à des ateliers avec les producteurs) Formation de 4 conseillers agricoles sur les pratiques AE (renforcement du conseil technique spécialisé - CTS) Identification des agriculteurs pour l'installation et animation des CEP (36 agriculteurs identifiés sur 200 agriculteurs sensibilisés) Formation de 50 agriculteurs, dont 30% de femmes, sur la conduite des parcelles de multiplication des semences des plantes améliorantes pour certification Installation et animation de 36 CEP champs écoles paysans Installation de 65 parcelles semencières Identification des besoins en recherche sur des questions agroécologique de l'OPA ciblée (production biomasse et les alternatives en fumure, ITK de récolte performante de semences de plantes améliorantes) Mise en œuvre du Conseil Technique Spécialisé (CTS) à travers le renforcement du dispositif technique du partenariat Formation sur la production et l'utilisation du bokashi (4tonnes) Formation des agriculteurs et agricultrices pour la production et la certification déclarée des semences de plantes améliorantes suivant le RTA des plantes améliorantes 200 producteurs ont été sensibilisés sur les pratiques agroécologiques et GDT/ACC à travers l'émission « Sol dans la Cité » Production et multiplication de 3 manuels filières (soja, manioc, igname) sur les pratiques agroécologiques et de GDT/ACC Suivi des activités des producteurs par les conseillers agricoles et le chef projet Mission de suivi évaluation de l'UCP du PAE Organisation des visites d'échange au profit des producteurs (60)
17	Burkina Faso	Organisation d'un atelier national d'échanges et de réflexion sur l'outil d'évaluation des systèmes de production agroécologique « outil AVACLIM » précédemment développé (28 personnes dont 6 femmes : ONG, producteurs, structure étatique) Identification de 5 sites maraichers et expérimentation de l'outil sur les sites identifiés – formation des agents collecteurs de données (2 stagiaires, femmes)

		Organisation des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'agroécologie : projections vidéo, images d'illustrations et témoignages (301 producteurs/transformateurs, dont 136 femmes) La conduite de l'application de l'outil simplifié sur les sites identifiés ; La contextualisation de l'outil d'évaluation des systèmes agroécologiques mis au point dans le cadre du projet AVACLIM ; La validation sur le plan scientifique de la démarche de promotion de semences paysannes promue par ARFA avec 2 fiches techniques sur 3 validées; La promotion des semences paysannes (6 variétés) ; L'organisation d'un atelier de formations des membres du CNABio sur l'utilisation de l'outil d'évaluation L'organisation d'un atelier d'amendement de l'outil AVACLIM simplifié traduit en langues mooré et gourmatchéma ; L'organisation d'un atelier de validation de l'outil AVACLIM simplifié traduit en langues mooré et gourmatchéma et de formation des producteurs sur son utilisation pour évaluer les effets des systèmes agroécologiques.
18	Cap Vert	NA – pas d'Accord de subvention signé
19	Côte d'Ivoire	Organisation de focus group (120 producteurs au total) et réunions de concertations (30 producteurs) pour l'identification des besoins en innovations des producteurs Formation de 10 animateurs sur la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP), techniques d'animation d'un CEP et bonnes pratiques AE Mise en place de 4 CEP Formation de 120 producteurs, dont 60 femmes, sur les bonnes pratiques d'associations et rotations des cultures (60 ménages), les associations culturales (60 ménages), l'utilisation des cendres de cuisine et engrais organique (24 ménages), la jachère améliorée (50 ménages) Evaluation des connaissances acquises par les producteurs via leu de rôle J'igname Conduite des expérimentations à base de fiente de volaille combinée à la cendre de cuisine et de la jachère améliorée de Mucuna avec diverses cultures principalement l'igname Distribution des semences aux producteurs Encadrement, collecte de données et suivi des producteurs dans la conduite des activités Organisation de 24 visites commentées sur les parcelles expérimentales et de visites sur les exploitations agricoles pour 1414 personnes dont 253 femmes Encadrement des producteurs sur l'amélioration de la qualité des semences issues de la campagne 2023 et suivi des activités auprès des producteurs Collecte des données sur la conservation des semences est en cours dans les stockages

		Poursuite en 2024 des expérimentations des performances des rotations et des associations culturales dans la gestion de la fertilité du sol et le contrôle des ravageurs Recyclage des producteurs, productrices et animateurs formés en 2023 sur la conduite des activités et expérimentation en 2024 Evaluation des résultats des expérimentations de 2023 : l'innovation Cendre de cuisine + engrais organique, a augmenté le rendement moyen du maïs grain de 221% par rapport aux pratiques habituelles des ménages (engrais chimique + insecticide chimique), passant de 1,3 t/ha à 4 t/ha. L'innovation jachère améliorée à base de *Mucuna* spp en 2 ans, a également permis d'augmenter le rendement moyen en tubercule d'igname de 112% par rapport aux pratiques habituelles des ménages (jachère naturelle de 3 ans), passant de 7,9t/ha à 16,4t/ha. Formation des ménages sur l'association du niébé au manioc dans les CEP Expérimentation par les membres des CEP de l'association du niébé au manioc en 2024 après avoir reçu la formation théorique sur cette association Evaluation du rendement moyen du manioc obtenu dans les CEP Recyclage des dix (10) techniciens sur les techniques d'animation des CEP et les bonnes pratiques agroécologiques Organisation de 32 visites commentées (VC) dans les 4 CEP à raison de 8 VC/CEP Reportage de la radio la « voix du Béré » de Mankono sur les activités du projet lors d'une visite commentée dans les CEP et est diffusé régulièrement les matins sur les ondes de cette radio qui couvre toute la région du Béré.
20	Gambie	Identification et diffusion de 3 variétés de maïs intelligentes sur le plan climatique (résistance à la sécheresse, cycle court et rendement élevé) Mise en place de 5 parcelles de démonstration sur les variétés de maïs climato-intelligentes (le semis direct, l'intégration agriculture-élevage, les cultures intercalaires, la rotation des cultures, la production conventionnelle de maïs et l'agroforesterie) 5 missions de suivi-contrôles ont été effectuées au niveau des parcelles de démonstrations 5 pratiques agroécologiques clés ont été mises à l'échelle (semis direct, cultures intercalaires et intégration agriculture-élevage) Création de 5 plateformes d'innovation en matière de production agroécologique de maïs dans diverses régions (LRR, NBR, CRR-Nord et Sud, et URR) Formation de 88 agriculteurs, 7 agents de vulgarisation et des membres d'organisations agricoles aux bonnes pratiques agricoles (BPA) pour le maïs Elaboration et diffusion d'un manuel de formation sur les BPA
21	Ghana	Etude de base pour la priorisation participative des bonnes pratiques AE, puis atelier de priorisation avec la participation de 29 personnes dont 20 producteurs Etablissement de 7 parcelles de démonstration (variété de maïs résiliente au CC, paillage et semis direct, culture de couverture Mucuna + technologies de gestion de l'eau, application des engrais organiques et inorganiques) Formation et sensibilisation de 471 producteurs sur les bonnes pratiques AE priorisées

		Augmentation du rendement de 58,82% et des revenus de 63% sur le maïs Organisation de visites d'échanges sur les sites expérimentaux au profit d'autres producteurs : 445 dont 167 femmes et 221 jeunes Mise en place de plusieurs pratiques agroécologiques : 1. Relais maïs Canavalia en alternant la position des cultures précédentes ; 2. Interculture de maïs et de niébé ; 3. Gestion intégrée de la fertilité du sol en utilisant le maïs comme culture test ; 4) Parcelles de mucuna buissonneuse et de mucuna tropicale et 5) parcelles de niébé seul Formation en agroécologie organisée pour renforcer les capacités des participants sur les pratiques agroécologiques éprouvées, suivie par 515 personnes dont 7 femmes (agriculteurs, agents de vulgarisation, des vendeurs d'intrants ainsi que des membres de la communauté) Réalisation de documentaires vidéos, de factsheets, de manuels, de compendium, d'émissions radio et diffusions des vidéos sur Joy TV, YouTube et autres canaux Organisation de 2 ateliers de revue et de sensibilisation sur les bonnes pratiques agroécologiques Appui à l'OPA (NFFAWAG) pour son enregistrement et l'ouverture de son compte bancaire Elaboration d'un guide d'utilisateur sur les pratiques agroécologiques
22	Guinée	Réalisation d'un diagnostic agraire des bassins de production des principales spéculations (maïs, riz, manioc) pour déterminer le fonctionnement des OP et les pratiques endogènes agroécologiques Formation des équipes mixes Chercheur/Conseil/OPA sur les notions d'agroécologie et les outils de planification Formation des producteurs (75) sur les techniques d'installation et de suivi des champs écoles paysans Organisation de 2 missions de supervision, d'appui technique et de suivi des champs écoles paysans Mise en place de 3 comités de transition écologique dans les principaux bassins de production Mise en place de 2 plateformes régionales multi acteurs Organisation des journées portes ouvertes avec la participation de 75 personnes Organisation des ateliers de planification régionale annuelle pour les paysans Organisation d'un atelier de diffusion des fiches techniques développées par la recherche
23	Guinée-Bissau	Identification des sites d'intervention du projet et cartographie des agriculteurs professionnels Formation de 194 producteurs, dont 168 femmes sur les biofertilisants, les biopesticides Identification des agriculteurs pour la fertilisation des sols et la lutte contre les ravageurs et maladies des cultures

		Organisation de 10 sessions de formation au total sur les pratiques agroécologiques Identification de 14 agriculteurs qui ont commencé à expérimenter les biofertilisants à base de pulpe de cajou et les biopesticides à base de figues dans tous les sites 14 champs expérimentaux mis en place
24	Liberia	Diagnostic des sites, total de 1 ha identifié pour le développement des activités Sensibilisation de 150 producteurs, dont 79 femmes au projet et au concept d'AE Approvisionnement et ensemencement de parcelles de démonstration de riz avec du tilapia du Nil (souche G) - 4 500 reproducteurs de tilapia répartis dans 6 parcelles de démonstration riz-poisson à une densité de 750 par parcelle Formation de 20 producteurs (dont 9 femmes) aux pratiques de production et de gestion des juvéniles, développement de systèmes de production, de bassins piscicoles et de transformation des aliments en utilisant des ingrédients d'aliments locaux disponibles localement ainsi que des pratiques de gestion efficaces pour un système riz-poisson durable Formation de 15 producteurs (dont 6 femmes) sur les pratiques d'intégration riz-poisson Elaboration d'un plan stratégique pour l'élaboration d'un plan d'affaires à utiliser pour obtenir un financement post-projet Formation de 20 producteurs (dont 7 femmes) sur la production de riz en zone humide et son packaging Formation de 46 producteurs (dont 28 femmes) sur la production de légumes en bordure de marécages Production de 3 brochures de vulgarisation (1- Semences de poisson de qualité pour l'agriculture intégrée ; 2- Semences de riz de qualité pour la culture intégrée ; 3- Innovation dans la culture riz-poisson) Construction de 18 sites de démonstration, dont 15 ont été récolté et replanté Formation de 15 producteurs (dont 7 femmes) dans la gestion des étangs de nurserie pour la production d'alevins Un atelier de formation de recyclage pour les formateurs de formateurs (ToT) a été organisé pour 15 formateurs de coopératives (9 hommes et 6 femmes), dans le but de renforcer leurs compétences dans la gestion des fermes intégrées Une formation de recyclage pour 15 agriculteurs de coopératives maraîchères (8 hommes et 7 femmes) a été organisée, portant sur les technologies de production de légumes Une formation sur la gestion post-récolte a été réalisée, avec des exercices pratiques sur la récolte manuelle
25	Mali	NA – pas d'Accord de subvention signé

26	Niger	Etude pour évaluer les innovations agroécologiques promues par le projet Cathi Gao dans la région de Maradi Formation de 24 producteurs issus de 21 villages sur diverses techniques, notamment la Régénération Naturelle Assistée (RNA), la production de fumures organiques, la fabrication de boules de semences, l'utilisation de l'urine hygiénisée en agriculture, l'alimentation des chèvres rousses, et la fertilisation à base de frass de la Mouche Soldat Noire Création d'une plateforme (WhatsApp) des producteurs formés en agroécologie pour assurer le suivi et le partage des connaissances
27	Nigeria	Identification de nouveaux besoins en recherche avec les producteurs à travers des focus groupes Identification des opportunités et des barrières pour l'adoption des pratiques agroécologiques au Nigéria Priorisation des variétés de sorgho et des pratiques de gestion du paysage Sélection, hiérarchisation et gestion des pratiques sur la base des critères sélectionnés pour les variétés Mise en place des parcelles de démonstration (un de 0.25ha et 2 de 0.1ha) avec deux variétés de sorgho et la fertilisation organique Neuf (9) parcelles de démonstration ont été établies dans trois les (3) zones (9 communautés) de l'État de Kaduna et 2 parcelles sur les sites de l'institut Conduite et suivi des activités au niveau des parcelles de démonstrations Utilisation de la bouse de vache comme engrais organique, le niébé comme culture de couverture pour améliorer la qualité du sol et pour la diversification Formation des producteurs sur la connaissance des différentes variétés de sorgho, la production durable de sorgho, les liens avec le marché et les fournisseurs d'intrants et la valorisation du sorgho pour l'alimentation humaine, animale et le carburant Organisation des visites d'échange ont été organisées sur les sites de démonstration des trois zones Organisation d'un atelier des parties prenantes pour les liens entre les agriculteurs, les distributeurs d'intrants et le marché en vue d'une production durable de sorgho Elaboration d'un guide de production du sorgho en Anglais et en langue locale Haoussa Organisation de journées verte et brune sur le terrain entre producteurs, agents de vulgarisation et scientifiques sur les variétés de sorgho et les bonnes pratiques AE Organisation d'atelier sur la valeur ajoutée du sorgho (transformation) avec les femmes
28	Sénégal	Tenue en février de l'atelier de partage du projet avec les partenaires du projet au Sénégal que sont la DPV, l'ISRA et d'élaboration de feuille de route des activités de 2024 (adoption d'une stratégie de démarche participative avec l'ensemble du consortium, identification des zones d'intervention du projet, discussions sur le renforcement de la dynamique des plateformes nationales qui s'activent dans la transition agroécologique : DyTAES et PNAEB) Atelier de lancement et identification des besoins en formation et en renforcement de capacité des bénéficiaires en juin 2024 Formation de 54 producteurs sur l'usage sécurisé des pesticides, dont 42 femmes

		Une visite d'échange avec 30 participants a été effectué avec les producteurs leaders des OPA dans une ferme école agro écologique (Kaidara)
29	Sierra Leone	Organisation de 2 visites d'échange pour les membres de l'OPA et membres de l'Unité de vulgarisation & recherche à Koinadugu Women's Vegetable Farmer's Cooperative (20 producteurs, dont 17 femmes) puis Fiama Agricultural Business Centre of Kono (18 producteurs, dont 6 femmes) : compréhension approfondie des opérations de l'organisation, vue d'ensemble des pratiques agroécologiques, possibilités de collaboration Formation de 15 membres d'OPA, dont 5 femmes, sur l'approche systémique de l'AE et les pratiques AE Formation de 15 agents de vulgarisation sur l'application des pratiques AE Organisation d'une 3ème visite d'échange à Bombali auprès de producteurs de riz (participation de 15 producteurs, dont 8 femmes) Organisation d'ateliers de dissémination des pratiques AE auprès des agriculteurs pour 30 producteurs, dont 10 femmes Mise en place et animation d'un champ école Conduite des séances de sensibilisations de mass au niveau de 3 OPA dans différentes provinces Vulgarisation à large échelle des pratiques agroécologiques par des spots et émissions radios
30	Togo	Atelier de lancement officiel en février Diverses réunions de coordination organisées entre les membres du consortium Conduite de l'étude d'identification des pratiques agroécologiques endogènes et des besoins en agroécologie Un atelier de restitution des résultats de cette étude aux bénéficiaires et autres acteurs du développement agricole dans la zone du projet ; La formation des producteurs relais et conseillers agricoles en agroécologie et en méthodes participatives de conseil agricole ; Le recyclage des formateurs des fermes écoles agroécologiques membres de REJEPAAT Installation et suivi des activités des parcelles de démonstration et des essais participatifs des pratiques agroécologiques Organisation des voyages d'échanges en agroécologie au centre songhaï au Bénin voisin et dans les fermes écoles agroécologiques au Togo Organisation de la mission de suivi-évaluation de l'ARAA 10 réunions de coordination du projet tenues

Annexe 3 : Résumé des activités conduites par les Correspondants Nationaux

Au titre de la composante ATA (composante concernant uniquement les CN des pays couverts par le PATAE)

- Participation au lancement officiel des projets de terrain du 17 au 21 juin 2019 à Lomé
- Missions de suivi-évaluation et appuis diverses auprès des projets de terrain, dont certaines organisées conjointement avec l'UCP/ARAA

Au titre de la composante FRC

- Participation au lancement officiel des projets des centres de formation
- Appui à l'identification des centres de formation à appuyer par le PAE
- Missions de suivi-évaluation et appuis diverses auprès des centres de formation (hormis ceux de la Guinée-Bissau et du Mali), dont certaines organisées conjointement avec l'UCP/ARAA

Au titre de la composante ACV

- Participation au lancement officiel des projets de partenariats
- Appui à l'identification des partenariats à appuyer par le PAE
- Appui au recensement des réseaux et plateformes nationales autour de l'agroécologie dans le pays
- Missions de suivi-évaluation et appuis diverses auprès des partenariats OPA-CR-CF (hormis ceux du Cap Vert et du Mali), dont certaines organisées conjointement avec l'UCP/ARAA
- Développement et validation des modules de formation sur l'agroécologie, destiné à servir de matériel de référence pour les agents de vulgarisation agricole (sauf au Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Niger et Nigéria) – **au total 9 pays ont développé des modules de formation**
- Formation des agents de vulgarisation – **au total, 331 agents de vulgarisation ont été formés**

➔ cf. colonne ACV.2 plus bas pour plus de détails

Au titre de la composante ECP

- Participation à l'atelier régional technique de renforcement de capacités pour l'utilisation de TAPE/GTAE du 26 au 29 juillet 2022 à Abidjan
- Participation au Forum régional de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest organisé par 3AO du 10 au 13 décembre 2022 à Bissau
- Participation à atelier de restitution de l'étude financement du 18 au 20 septembre 2023 à Lomé
- Participation à la formation sur la communication du 21 au 22 septembre 2023 à Lomé
- Participation annuelle aux ateliers bilan et planification des CN
- Participation à la formation sur l'accès au fonds climat du 25 au 29 octobre 2024 à Abuja
- Traduction dans 3 langues locales et diffusion dans les radios locales et de proximité, des spots de sensibilisation mises à disposition par l'UCP (sauf Gambie, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger,

Nigéria et Sierra Leone / Bénin : en attente de diffusion / Togo : en cours de validation) – **au total, 6 pays ont diffusé des spots radio de sensibilisation à l'agroécologie en langues locales (Burkina Faso, Guinée, Cap Vert, Sénégal, Ghana et Côte d'Ivoire)**

- Formulation et validation du plan d'actions et de la charte de fonctionnement du cadre de concertation nationale (CCN) (hormis Guinée-Bissau, Libéria, Mali et Niger / Cap Vert et Togo : documents en attente de validation) - **au total, 9 cadres de concertation mis en place**
- Tenue des sessions du CCN – **au total, 35 sessions des cadres de concertation tenues**
- Participation à diverses réunions d'échanges sur l'AE

➔ cf. colonne ECP.3 plus bas pour plus de détails

Les difficultés rencontrées de manière transversale au niveau des CN les suivantes :

- Retard dans la mise à disposition des fonds, compromettant l'exécution à temps des activités
- Instabilité politique, entravant la continuité des actions
- Sensibilité limitée des autorités nationales à la mise en œuvre du programme
- Dépendance de la volonté et de l'implication des CN pour avancer
- Plusieurs changements de points focaux
- Pénurie de spécialistes disposant d'une expertise formelle en agroécologie dans certains pays
- Manque de ressources pour assurer une mise en œuvre rapide et efficace
- Hausse de l'insécurité civile dans plusieurs régions
- Retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, et l'absence de signature des avenants pour poursuivre les activités en 2024
- Retards occasionnels dans la réponse de l'UCP aux demandes des CN (par exemple, sélection de prestataires, retours sur les TDR et certains documents)
- Fonds insuffisants pour organiser des CCN d'envergure
- Retards dans les financements auprès du CF et du partenariat OPA-CR-CF

Détails des activités ACV.2 et ECP.3

PAYS Activités PTBA CN	ACV.2 : Renforcement des capacités et appui méthodologiques aux dispositifs de vulgarisation	ECP.3 : Organisation des concertations nationales et des partenariats autour des transitions agroécologiques pour la prise en compte de l'AE dans les politiques publiques
BENIN	1 formation réalisée en décembre 2023 à Lokossa sur la méthodologie d'intégration de l'AE dans le dispositif du conseil agricole : 30 acteurs formés, dont 8 femmes *2ème session prévue une fois les fonds reçus*	Tenue de 3 sessions du CCN : août 2023, octobre 2023 et août 2024 Organisation des journées de l'AE du 29 novembre au 02 décembre 2023 (plan d'actions du CCN) *Organisation de la* semaine nationale de *l'agroécologie prévue en novembre 2024*
BURKINA	1 atelier de formation en septembre 2023 à Ziniaré : 26 participants formés	Tenue de 3 sessions du CCN : novembre 2021, décembre 2023, janvier 2024 Edition et diffusion en septembre 2023 de la charte des acteurs de l'agroécologie Réalisation d'un film documentaire de 26 min sur les réalisations du PAE auprès des projets de terrain Organisation de 2 sessions de formation des élus consulaires des chambres régionales d'agriculture de la confédération paysanne du Faso (48 participants au total)
CAP VERT*	*Non réalisé*	Version provisoire du PA et de la charte de fonctionnement du CCN en attente de validation
COTE D'IVOIRE	2 sessions de formation des dispositifs nationaux d'appui-conseil et de vulgarisation en juillet 2024 à Abidjan (au cours d'un seul atelier) : X participants 1 session de formation en août 2024 à Mahou : XX participants	Tenue de 1 session du CCN : mars 2024
GAMBIE*	*Session de formation non encore réalisée*	Organisation d'une réunion de concertation des acteurs *Tenue du 1er CCN d'ici la fin de l'année*
GHANA	1 session de formation en août 2024 à Mahou : 68 participants, dont 16 femmes Formation de 40 agents de vulgarisation du en novembre à Nkawie Création de champions nationaux de l'AE Création d'une plateforme whatsapp pour le partage de connaissances	Sensitization of 134 state and non-state actors on the action plan and charter for the national consultation framework through national consultations and policy dialogue meetings Preparation of guidelines to facilitate mainstreaming agroecology into agriculture sector policies and strategies Identification of potential sources of funding for the implementation of the action plan and charter Identification of agroecology hotspots in the country. Tenue de 4 session du CCN

		Exhibition of agroecology training manuals, T-shirts, caps, notepad and bags at the 39th National Farmers Award Day Celebration training, to help increase the visibility of the project in Ghana
GUINEE	*Session de formation prévue avant la fin de l'année*	Tenue d'1 CCN *Organisation d'un atelier CCN prévu la 2ème semaine du mois d'octobre*
GUINEE BISSAU	*Pas de formations réalisées*	Organisation d'un atelier de formation pour les membres et partenaires de QNC sur des sujets qui alimentent les politiques publiques en faveur de l'AE Organisation d'un atelier de formation sur les techniques de plaidoyer (30 personnes formées, dont les membres et partenaires de QNC) Participation à diverses réunions d'échanges sur l'AE
LIBERIA	Validation du manuel de formation *Session de formation prévues en décembre non réalisée*	TDR du consultant élaborés *Lancement de la consultation en attente de la réception des fonds* *Atelier de validation de la stratégie sur l'agroécologie en attente*
MALI*	Pas de formations réalisées	Formulation du PA mais non validé
NIGER*	Pas de formations réalisées	Rien
NIGERIA*	*Session de formation à tenir une fois les fonds reçus (modules validés ?)*	*Tenue du 1er CCN prévue une fois les fonds reçus*
SENEGAL	Organisation de 2 ateliers de formation organisées au profit des formateurs relais de la société civile et des élus locaux : 60 formateurs relais formés, dont 10 femmes Formation au profit des directeurs régionaux de l'agricultures et des services départementaux de l'agriculture sur les changements climatiques et les innovations agroécologiques a été organisée en collaboration avec le Programme Filets Sociaux financé par la Banque mondiales et l'Etat du Sénégal : 20 agents techniques formés 2 sessions de sensibilisation et formations sur la gestion écologique de l'Aflatoxine : 120 producteurs formés	Appui à la mise en œuvre et l'animation de la Dynamique Nationale pour la Transition Agroécologique (DyTAES) Redynamisation de la Plateforme Nationale pour l'Agroécologie Ecologique et Biologique (PNAEB) Co-organisation des journées nationales de l'AE (JNA) organisées par la DYTAES en 2023 et 2024 Participation à diverses réunions d'échanges sur l'AE
SIERRA LEONE	Organisation d'une session de formation aux agents de vulgarisation en fin 2024 : XX participants Organisation d'une session de formation pour 40 agriculteurs sur les techniques de production de matériaux adaptatifs sensibles à	TDRs en cours d'élaboration pour recruter un consultant pour le développement d'une stratégie nationale sur l'AE Tenue d'1 session du CCN *Mise en œuvre du PA du CCN en attente des fonds*

	l'agroécologie (fumier de compost, utilisation de semences améliorées, etc.)	
TOGO	Organisation d'une session de formation aux agents de vulgarisation en décembre 2024 : 42 agents formés	Validation de la stratégie de promotion de l'AB et de l'AE (via 2 ateliers) Organisation de plusieurs réunions de concertation des acteurs *Validation du PA et de la charte prévue au dernier trimestre* Tenue du 1er CCN en décembre 2024

Annexe 4 : PTBA 2025 consolidé du PAE

Composantes / Activités	Description sommaire des activités/tâches	Prévisions 2025 PATAE AFD	Prévisions 2025 PAIAD UE	Total PTBA 2025 PAE	T1 2025	T2 2025	T3 2025
ATA		**145 400,09 €**	**- €**	**145 400,09 €**			
ATA.1	-	- €	- €	- €			
ATA.2	Prise en charge de la participation des représentants des porteurs de projets à l'atelier de clôture	78 798,79 €	- €	78 798,79 €			
ATA.3	Finalisation du document de capitalisation des bonnes pratiques, traduction et impression / contrat Issala	66 601,30 €	- €	66 601,30 €			
FRC		**- €**	**496 126,55 €**	**496 126,55 €**			
FRC.1							
FRC.2	Poursuite des activités des centres de formation jusqu'en mars 2025	- €	75 000,00 €	75 000,00 €			
	Participation des représentants des centres de formation à l'atelier de clôture	- €	100 000,00 €	100 000,00 €			
FRC.3.1	Adaptation du Mooc / Contrat institut Agro	- €	156 126,55 €	156 126,55 €			
	Participation des représentants du Consortium d'Université et de l'Institut Agro à l'atelier de clôture	- €	15 000,00 €	15 000,00 €			
FRC.3.2	**Contribution à Ecowas e-learning**	- €	**150 000,00 €**	**150 000,00 €**			
ACV		**- €**	**296 950,00 €**	**296 950,00 €**			
ACV.1	Poursuite des activités des partenariats jusqu'en mars 2025	- €	35 000,00 €	35 000,00 €			
	Participation des représentants des partenariats à l'atelier de clôture	- €	100 000,00 €	100 000,00 €			
ACV.2.1	Consolidation des connaissances , mise en place et dynamisation des plateformes / Contrat CIRAD	- €	99 950,00 €	99 950,00 €			
ACV.2.2	**Contribution à l'élaboration du Mémento de l'agroécologie**		**62 000,00 €**	**62 000,00 €**			
ECP		**278 746,52 €**	**390 903,04 €**	**669 649,56 €**			
ECP.1	Prise en charge des représentants de 3AO pour l'atelier de clôture du PAE	- €	10 000,00 €	10 000,00 €			
ECP.2	Dernières activités de communication / contrat Issala	5 600,00 €	- €	5 600,00 €			
	Finalisation de l'étude capitalisation / contrat LARES-GRET-Inter-Réseaux	- €	134 610,00 €	134 610,00 €			
	Budget de communication et impression des documents de capitalisation pour l'atelier de clôture du PAE	100 000,00 €	- €	100 000,00 €			
ECP.3	Activités de clôture des CN et participation à l'atelier de clôture du PAE	73 146,52 €	146 293,04 €	219 439,56 €			
	Atelier de clôture du PAE : coûts logistiques (location de salle, repas, traduction, etc.), hors perdiem, billets d'avion et communication	60 000,00 €	40 000,00 €	100 000,00 €			
	Prise en charge d'invités extérieurs + personnel ARAA/DADR + UCP pour l'atelier de clôture du PAE	40 000,00 €	60 000,00 €	100 000,00 €			
ECP.4		- €	- €	- €			
CG		**207 706,11 €**	**668 572,92 €**	**876 279,03 €**			
CG.1	Appui à la maitrise d'ouvrage dans la coordination et la gestion courante du PAE / contrat AVSF-IRAM-INADES	103 105,03 €	431 370,75 €	534 475,79 €			
CG.2	-			- €			
CG.3	Appui divers à l'ARAA dont équipements et financement du Comité de Pilotage 2025	50 000,00 €	**176 000,00 €**	**226 000,00 €**			
	Audit des comptes 2024 et finaux du PATAE et du PAIAD (comptes ARAA) / contrat PWC	34 000,00 €	20 000,00 €	54 000,00 €			
	Audits finaux des CN / 3AO / Centres de Formation / Partenariats / Contrat Pyramis	20 601,08 €	41 202,17 €	61 803,25 €			
EA		**- €**	**- €**	**- €**			
EA.1	-	- €	- €	- €			
DI		**- €**	**- €**	**- €**			
FG		**- €**	**- €**	**- €**			
Total général		**631 852,72 €**	**1 852 552,52 €**	**2 484 405,24 €**			
